



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN



Fecha reporte

Wednesday July 3 2019 10:16 AM

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		MEJORAMIENTO Y ADECUACION ENTRADA AL MUNICIPIO - CRUCE LA ARCADIA TRES ESQUINAS Y REHABILITACION DE LOS SECTORES CRITICOS VIA CAMPOALEGRE - ALGECIRAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA								
Código BPIN		2016004410011		Sector reclasificado SMSE		Transporte - Vial Red Secundaria				
Localización		Departamento		Municipio			No. Beneficiarios		11,234	
		HUILA		ALGECIRAS						
Plazo inicial (meses)	15.00	Plazo transcurrido (meses)	15.00	Plazo estimado (meses)	22.43	Fecha Inicio	01/05/2018	Fecha Final	31/07/2019	
Productos							Unidad		Cantidad	
Rehabilitacion de km de la red vial de Segundo Orden							Kilómetros		2	

APROBACIÓN



Ocad	DEPARTAMENTO DE HUILA	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION
Entidad Ejecutora	HUILA	Entidad Interventora	HUILA		
Acuerdo	03	Fecha	25/05/2017	Ocad	DEPARTAMENTO DE HUILA
Ajustes					
No.	Número	Tipo	Ocad	Acuerdo	Fecha

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		4,988,504,392	100.00	4,604,424,999	6,598,637,905	- 1,610,133,513
Asignaciones Directas	HUILA	4,488,504,392	89.98	4,104,424,999	6,098,637,905	- 1,610,133,513
Fondo De Compensación Regional	ALGECIRAS-HUILA	500,000,000	10.02	500,000,000	500,000,000	0
TOTAL FUENTES		4,988,504,392	100.00	4,604,424,999	6,598,637,905	- 1,610,133,513
TOTAL FUENTES		4,988,504,392	100.00	4,604,424,999	6,598,637,905	- 1,610,133,513

EJECUCIÓN

Estado: CONTRATADO EN EJECUCIÓN

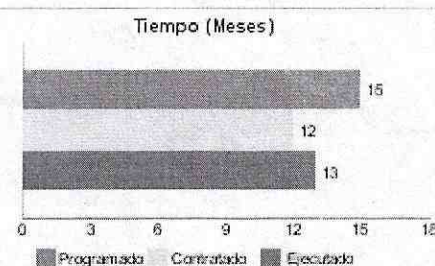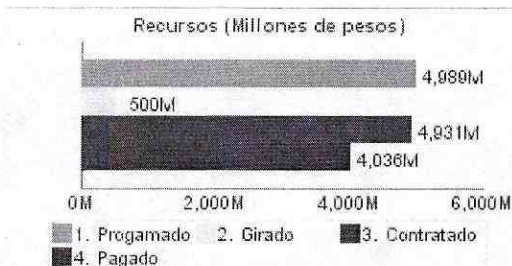

CONTRATACIÓN

Nº Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Ejecución inversión	4,604,424,999	3,860,799,187	83.85
1	Interventoría	326,273,998	175,529,887	53.80
				81.86




Fecha reporte

Wednesday July 3 2019 10:16 AM

% Ejecución Financiera Agregada de Contratos

4,930,698,997


4,036,329,074



INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Kilómetros de red vial rehabilitados y mantenidos	2.3	Kilómetros	0	.00

% Ejecución de Indicadores del Proyecto




CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

Programación Consistente

JUSTIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN ACTUAL




Fuente: GESPROY-SGR

Proporción de retraso (%)	.00
Rendimiento (%)	66.88
Plazo estimado de terminación (meses)	22.43

TIEMPO DE INICIO DE CONTRATACIÓN


Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación



Fuente: GESPROY-SGR

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INICIAL

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY-SGR



Fuente: GESPROY-SGR

RELACIÓN AVANCE FINANCIERO VS. AVANCE FÍSICO

Relación avance financiero vs avance físico	1.21
Valor indicador	94.67

PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN



El futuro
es de todos


DNP
Departamento
Nacional de Planeación

NOTA DE INFORMACIÓN DE PROYECTO SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN



Fecha reporte

Wednesday July 3 2019 10:16 AM

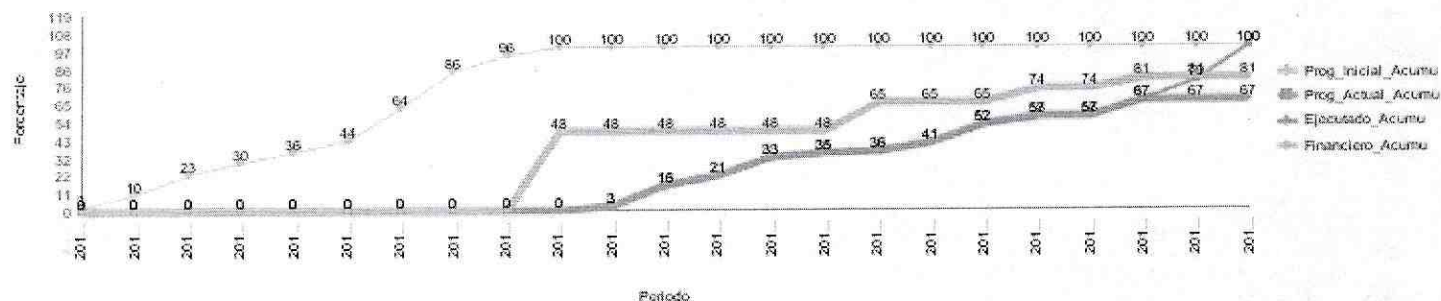

Fuente: GESPROY-SGR

# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
1	2017-sep	2.83	.00	.00	.00
2	2017-oct	10.44	.00	.00	.00
3	2017-nov	22.85	.00	.00	.00
4	2017-dic	30.20	.00	.00	.00
5	2018-ene	35.79	.00	.00	.00
6	2018-feb	43.50	.00	.00	.00
7	2018-mar	63.51	.00	.00	.00
8	2018-abr	85.59	.00	.00	.00
9	2018-may	95.56	.01	.00	.00
10	2018-jun	100.00	.25	.24	48.11
11	2018-jul	100.00	3.03	3.02	48.11
12	2018-ago	100.00	15.75	15.74	48.11
13	2018-sep	100.00	21.31	21.30	48.11
14	2018-oct	100.00	32.74	32.68	48.11
15	2018-nov	100.00	34.90	34.84	48.11
16	2018-dic	100.00	35.65	35.59	65.36
17	2019-ene	100.00	40.86	40.80	65.36
18	2019-feb	100.00	52.46	52.40	65.36
19	2019-mar	100.00	57.65	57.49	74.00
20	2019-abr	100.00	57.65	57.49	74.00
21	2019-may	100.00	66.70	66.88	80.91
22	2019-jun	100.00	79.10	66.88	80.91
23	2019-jul	100.00	100.00	66.88	80.91

ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
Información inconsistente-II	GESPROY-SGR	0
	SUBTOTAL	0
	TOTAL	0

**SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**

OBJETO:	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HACIA EL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA* Y "MEJORAMIENTO Y ADECUACION ENTRADA AL MUNICIPIO CRUCE LA ARCADIA TRES ESQUINA Y REHABILITACION DE LOS SECTORES CRITICOS VIA CAMPOALEGRE -ALGECIRAS											
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS PALESTINA Y ALGECIRAS			CTO No.		PLAZO		VALOR CONTRATO			BALANCE FISICO-FINANCIERO - SECTOR ALGECIRAS
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA HUILA 2018										
MUNICIPIO:		ALGECIRAS					INICIAL		\$ 585.918.240,00			
Iniciación		Suspensión		Reinicio	870 DE 2018		10 MESES					
23/may/2018		12 de marzo de 2019		6 de mayo de 2019			TOTAL		V.R. TOTAL			
							12 MESES		\$ 585.918.240,00			

CONDICIONES ORIGINALES

CANTIDADES ACTUALIZADAS

AVANCE FISICO

AVANCE FINANCIERO

No.	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PORCENTUAL	CANT.	VALOR
PRELIMINARES												
1,1	Localización, trazado y Replanteo	Km	2,20	\$ 3.962.554	\$ 8.717.619	2,40	\$ 3.962.554	\$ 9.510.130	2,20	92%	2,20	\$ 8.717.618,80
1,2	Retiro de cerca existente en alambre de Púas	ml	2.700,00	\$ 2.589	\$ 6.990.300	704,00	\$ 2.589	\$ 1.822.656	530,00	75%	530,00	\$ 1.372.170,00
1,3	Construcción de cerca de 4 hilos con poste en madera y alambre de púas Cal. 12	ml	2.700,00	\$ 24.169	\$ 65.256.300	643,90	\$ 24.169	\$ 15.562.419	334,90	52%	334,90	\$ 8.094.198,10
OBRAS DE DRENAJE Y CONTENCIÓN				\$ 80.964.219	\$ 26.895.205							
2,1	Demolicion de concretos de alcantarilla existentes. Incluye retiro	und	5,00	\$ 356.429	\$ 1.782.145	7,00	\$ 356.429	\$ 2.495.003	6,00	85,71%	6,00	\$ 2.138.574,00
2,2	Solado de limpieza en concreto de 2500 PSI para construcción de alcantarillas	m3	20,00	\$ 487.735	\$ 9.754.700	13,86	\$ 487.735	\$ 6.760.007	12,66	91,34%	12,66	\$ 6.174.725,10
2,3	Concreto de 3.000 PSI para construcción de Encoles, Descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas	m3	57,56	\$ 689.842	\$ 39.707.306	177,78	\$ 689.842	\$ 122.640.111	177,78	100,00%	177,78	\$ 122.640.110,76
2,4	Suministro e instalación de Acero de Refuerzo PDR 60 para construcción de alcantarillas	kg	1.546,00	\$ 4.250	\$ 6.570.500	34137,07	\$ 4.250	\$ 145.082.565	13.496,80	39,54%	13.496,80	\$ 57.361.400,00
2,5	Atrague lateral para alcantarillas en concreto ciclopeo	m3	24,00	\$ 493.242	\$ 11.837.808	9,30	\$ 493.242	\$ 4.587.151	6,20	66,67%	6,20	\$ 3.058.100,40
2,6	Suministro e instalación de Tubería en concreto f = 36"	ml	70,00	\$ 396.670	\$ 27.766.900	24,00	\$ 396.670	\$ 9.520.080	16,00	66,67%	16,00	\$ 6.346.720,00
2,7	Suministro e instalación de material granular filtrante	m3	1.514,71	\$ 110.416	\$ 167.248.219	630,91	\$ 110.416	\$ 69.662.559	465,20	73,73%	465,20	\$ 51.365.523,20
2,8	Construcción de Cuneta tipo INVIAS en concreto de 3.000 PSI	ml	4.207,53	\$ 88.938	\$ 374.209.303	3008,70	\$ 88.938	\$ 267.587.761	1.923,80	63,94%	1.923,80	\$ 171.098.924,40
2,9	Suministro e instalación de geotextil NT2400	m3	10.098,07	\$ 6.215	\$ 62.759.505	4900,08	\$ 6.215	\$ 30.453.997	3.204,50	65,40%	3.204,50	\$ 19.915.967,50
2,1	Sumidero lateral en concreto de 3.000 al200	un	4,00	\$ 2.490.273	\$ 9.961.092	4,00	\$ 2.490.273	\$ 9.961.092	0,00	0,00%	0,00	\$ -
2,11	Tubería PVC 10" Aguas lluvias	ml	125,00	\$ 60.946	\$ 7.618.250	163,00	\$ 60.946	\$ 9.934.198	0,00	0,00%	0,00	\$ -
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 719.215.728	\$ 678.684.524							
3,1	Excavación mecánica en material conglomerado (Incluye transporte)	m3	1.445,00	\$ 27.141	\$ 39.218.745	3154,70	\$ 27.141	\$ 85.621.713	3.154,70	100,00%	3.154,70	\$ 85.621.712,70
3,2	Excavación Mecánica en material común (Incluye transporte)	m3	350,00	\$ 19.330	\$ 6.765.500	7995,54	\$ 19.330	\$ 152.814.088	5.857,28	74,09%	5.857,28	\$ 113.221.222,40
3,3	Conformación y Compactación de terraplen con material enudo de río	m3	1.317,26	\$ 61.783	\$ 81.384.275	440,70	\$ 61.783	\$ 27.227.768	440,70	100,00%	440,70	\$ 27.227.768,10
3,4	Extensión, Conformación y compactación de Botaderos	m3	350,00	\$ 3.473	\$ 1.215.550	11060,24	\$ 3.473	\$ 38.412.214	7.291,68	65,93%	7.291,68	\$ 25.324.004,64
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				\$ 128.584.070	\$ 304.075.783							
4,1	Suministro, Instalación y compactación de Base Granular	m3	3.240,02	\$ 116.870	\$ 378.661.137	3625,16	\$ 116.870	\$ 423.672.449	2.938,54	81,06%	2.938,54	\$ 343.427.169,80
4,2	Suministro e Instalación de Emulsión Asfáltica para imprimación	m2	14.025,00	\$ 2.915	\$ 40.882.875	11690,80	\$ 2.915	\$ 34.078.682	11.690,80	100,00%	11.690,80	\$ 34.078.682,00
4,3	Suministro, Instalación y compactación de Mezcla Asfáltica en caliente MDC-19	m3	1.683,00	\$ 598.768	\$ 1.007.726.544	1115,40	\$ 598.768	\$ 667.865.827	1.115,40	100,00%	1.115,40	\$ 667.865.827,20
4,4	Concreto Hidráulico MR 4,0Mpa	m3	735,24	\$ 684.200	\$ 503.051.208	1002,25	\$ 684.200	\$ 685.739.450	251,79	25,12%	251,79	\$ 172.274.718,00
4,5	Transporte de materiales pétreos y asfalto	m3-km	243.862,00	\$ 1.358	\$ 331.164.596	238246,78	\$ 1.358	\$ 323.539.127	206.282,40	86,58%	206.282,40	\$ 280.131.499,20
4,6	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2.100,00	\$ 88.288	\$ 185.404.800	1642,55	\$ 88.288	\$ 145.017.454	1.642,55	100,00%	1.642,55	\$ 145.017.454,40
4,7	Instalación de material de subbase proveniente del reciclado	m3	2.100,00	\$ 27.614	\$ 57.989.400	1642,55	\$ 27.614	\$ 45.357.376	1.642,55	100,00%	1.642,55	\$ 45.357.375,70
4,8	Bordillo en concreto 3.000 psi	ml	107,00	\$ 71.900	\$ 7.693.300	1480,00	\$ 71.900	\$ 106.412.000	0,00	0,00%	0,00	\$ -

27.

28



SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HACIA EL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y "MEJORAMIENTO Y ADECUACION ENTRADA AL MUNICIPIO CRUCE LA ARCADIA TRES ESQUINA Y REHABILITACION DE LOS SECTORES CRITICOS VIA CAMPOLEGRE -ALGECIRAS											
	CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS PALESTINA Y ALGECIRAS			CTO No.	PLAZO		VALOR CONTRATO	BALANCE FISICO-FINANCIERO - SECTOR ALGECIRAS			
	INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA HUILA 2018										
	MUNICIPIO:	ALGECIRAS				INICIAL		\$4.585.918.240,00				
	Iniciación	Suspensión	Reinicio		870 DE 2018	10 MESES						
23/may/2018	12 de marzo de 2019	6 de mayo de 2019				TOTAL		V.R. TOTAL				
						12 MESES		\$4.585.918.240,00				

CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES ACTUALIZADAS			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
No.	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PORCENTUAL	CANT.	VALOR
SEÑALIZACION					\$ 2.512.573.860			\$ 2.431.682.365				\$ 1.688.152.726,30
5,1	Suministro e Instalación de Señale vertical sp.srs de 60 X 60 cm	und	17,00	\$ 350.858	\$ 5.964.586	17,00	\$ 350.858	\$ 5.964.586	0,00	0,00%	0,00	\$ -
5,2	Suministro e Instalación de Tacha reflectiva para señalización vial	Und	356,00	\$ 9.500	\$ 3.382.000	356,00	\$ 9.500	\$ 3.382.000	0,00	0,00%	0,00	\$ -
5,3	Lineas de demarcacion con pintura acrilica, incluye micro esferas	ml	2.312,00	\$ 2.349	\$ 5.430.888	2312,00	\$ 2.349	\$ 5.430.888	0,00	0,00%	0,00	\$ -
5,4	Punta para defensa metalica	und	16,00	\$ 74.809	\$ 1.196.944	16,00	\$ 74.809	\$ 1.196.944	0,00	0,00%	0,00	\$ -
5,5	Suministro, anclaje e Instalación de Defensa metalica	ml	320,00	\$ 219.741	\$ 70.317.120	320,00	\$ 219.741	\$ 70.317.120	0,00	0,00%	0,00	\$ -
SUBTOTAL					\$ 86.291.538			\$ 86.291.538		0,00%		\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 3.527.629.415			\$ 3.527.629.415				\$ 2.397.831.466,40
VALOR TOTAL PROYECTO					\$ 4.988.504.392			\$ 4.988.504.392				\$ 3.335.383.569,76

COSTO DIRECTOS		\$ 3.527.629.415
AIU = 30%		\$ 1.058.288.825
COSTO TOTAL		\$ 4.585.918.240
VALOR PROYECTO		\$ 4.988.504.392
COSTO TOTAL OBRA		\$ 4.585.918.240
VALOR ANTICIPO SUMINISTRADO A CONTRATISTA (50% VALOR CONTRATO)		\$ 2.302.212.500
VALOR ANTICIPO SUMINISTRADO A LA INTERVENTORIA		\$ 97.000.000
VALOR ACTAS DE OBRA		\$ 3.117.173.372
VALOR ACTAS DE INTERVENTORIA		\$ 154.620.139

OSVALDO RUIZ CUELLAR
R.L CONSORCIO VIAS PALESTINA Y ALGECIRAS
CONTRATISTA

RONALD ALEXIS GONZALEZ
R.L CONSORCIO INTERVENTORIA HUILA 2018
INTERVENTOR

AVANCE FISICO:		66,86%
ANTICIPO	\$	2.399.212.499,50
ACTAS DE OBRA	\$	1.635.896.755,55
TOTAL	\$	4.035.109.255,05
AVANCE FINANCIERO		80,9%
