



El futuro
es de todos

ONP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA DE INFORMACION DE PROYECTO

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN



Fecha reporte

Thursday August 22 2019 2:21 PM

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HACIA EL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA								
Código BPIN		2017004410006		Sector reclasificado SMSE		Transporte - Vial Red Secundaria				
Localización		Departamento		Municipio			No. Beneficiarios		11,821	
		HUILA		PALESTINA						
Plazo inicial (meses)	16.00	Plazo transcurrido (meses)	16.00	Plazo estimado (meses)	16.00	Fecha Inicio	01/05/2018	Fecha Final	31/08/2019	
Productos							Unidad		Cantidad	
Vía secundaria pavimentada							Kilómetros de vías secundarias		1.09	
Vía secundaria pavimentada							Kilómetros de vías secundarias		1.09	

APROBACIÓN




Ocad	DEPARTAMENTO DE HUILA	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION
Entidad Ejecutora		HUILA		Entidad Interventora	HUILA
Acuerdo		Fecha		Ocad	
04		28/06/2017		DEPARTAMENTO DE HUILA	
4		28/06/2017		HUILA - PALESTINA	
Ajustes					
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo
1	1128159	SOLICITUD AJUSTE ACUERDO EJECUTOR		DEPARTAMENTO DE HUILA	

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		2,938,577,592	100.00	0	0	2,938,577,592
Asignaciones directas	HUILA	2,938,577,592	100.00	0	0	2,938,577,592
TOTAL FUENTES APROBADAS		2,938,577,592	100.00	0	0	2,938,577,592
TOTAL FUENTES		2,938,577,592	100.00	0	0	2,938,577,592

EJECUCIÓN

Estado: **CONTRATADO EN EJECUCIÓN**

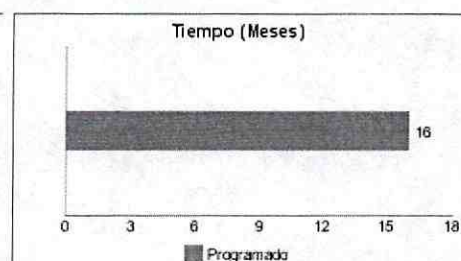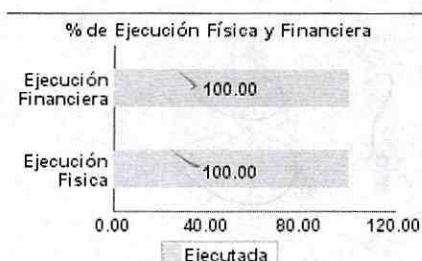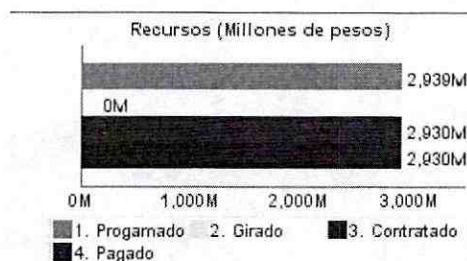

CONTRATACIÓN



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA DE INFORMACION DE PROYECTO

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN



Fecha reporte


Thursday August 22 2019 2:21 PM

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Ejecución inversión	2,737,838,956	2,737,838,719	100.00
1	Interventoría	192,089,883	192,089,883	100.00
		2,929,928,839	2,929,928,602	100.00



INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Vía secundaria mejorada	1.09	Kilómetros	1.04	95.41

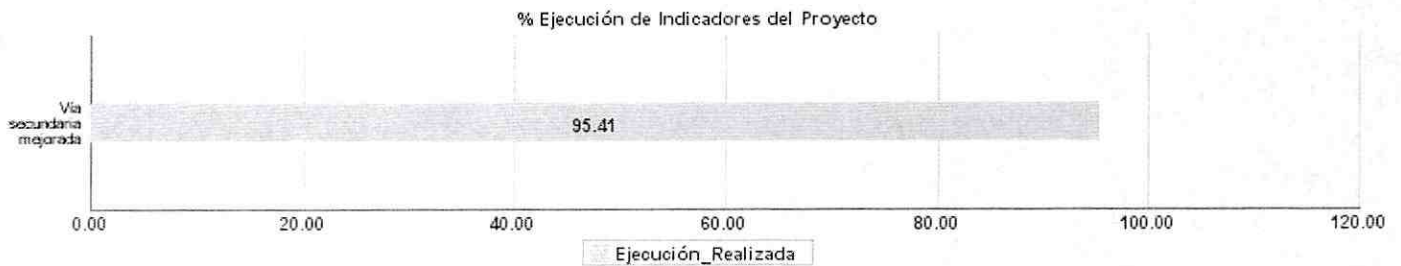


CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

Programación Consistente

JUSTIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN ACTUAL




Fuente: GESPROY-SGR

Proporción de retraso (%)	.00
Rendimiento (%)	99.97
Plazo estimado de terminación (meses)	16.00

TIEMPO DE INICIO DE CONTRATACIÓN


Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación



Fuente: GESPROY-SGR

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INICIAL

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY-SGR



Fuente: GESPROY-SGR

RELACIÓN AVANCE FINANCIERO VS. AVANCE FÍSICO

Relación avance financiero vs avance físico	1.00
Valor indicador	100.00

PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación


FICHA DE INFORMACION DE PROYECTO

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN



Fecha reporte

Thursday August 22 2019 2:21 PM



Fuente: GESPROY-SGR

Periodo

# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
1	2017-dic	14.61	.00	.00	.00
2	2018-ene	29.41	.00	.00	.00
3	2018-feb	63.12	.00	.00	.00
4	2018-mar	100.00	.00	.00	.00
5	2018-abr	100.00	.00	.00	.00
6	2018-may	100.00	.00	.00	.00
7	2018-jun	100.00	.58	.58	48.55
8	2018-jul	100.00	8.33	8.33	48.55
9	2018-ago	100.00	21.69	21.69	48.55
10	2018-sep	100.00	46.47	46.47	48.55
11	2018-oct	100.00	53.92	53.91	70.18
12	2018-nov	100.00	82.93	82.93	70.18
13	2018-dic	100.00	85.97	85.97	89.46
14	2019-ene	100.00	87.52	87.52	89.46
15	2019-feb	100.00	87.52	87.52	89.46
16	2019-mar	100.00	87.52	87.52	92.89
17	2019-abr	100.00	87.52	87.52	92.89
18	2019-may	100.00	99.98	99.97	98.79
19	2019-jun	100.00	99.98	99.97	99.71
20	2019-jul	100.00	99.98	99.97	99.71
21	2019-ago	100.00	100.00	99.97	99.71

ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
Información inconsistente-II	GESPROY-SGR	0
	SUBTOTAL	0
	TOTAL	0



SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HACIA EL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA* Y "MEJORAMIENTO Y ADECUACION ENTRADA AL MUNICIPIO CRUCE LA ARCADIA TRES ESQUINA Y REHABILITACION DE LOS SECTORES CRITICOS VIA CAMPOALEGRE -ALGECIRAS									
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS PALESTINA Y ALGECIRAS			CTO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO	BALANCE FISICO-FINANCIERO AGOSTO DE 2019		
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA HUILA 2018								
MUNICIPIO:		PITALITO			870 DE 2018	INICIAL	\$2.756.345.716,00			
Iniciación		Suspensión	Reinicio			10 MESES				
23-May-2018						TOTAL	V.R. TOTAL			
							\$2.756.345.716,00			

CONDICIONES ORIGINALES

No.	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
						CANT.	VALOR PORCENTUAL	CANT.	VALOR
	PRELIMINARES								
1,1	Descapote y limpieza de capa vegetal	Ha	0,38	\$ 218.874	\$ 83.172	0,38	100,00%	0,38	\$ 83.172,12
1,2	Retiro de cerca existente en alambre de Púas	ml	1.200,00	\$ 3.269	\$ 3.922.800	482,10	40,18%	482,10	\$ 1.575.984,90
1,3	Construccion de cerca de 4 hilos con poste en madera y alambre de puas Cal. 12	ml	1.200,00	\$ 28.783	\$ 34.539.600	651,10	54,26%	651,10	\$ 18.740.611,30
	SUBTOTAL				\$ 38.545.572		52,92%		\$ 20.399.768,32
	OBRAS DE DRENAJE Y CONTENCION								
2,1	Demolicion de concretos de alcantarilla existentes. Incluye retiro	und	6,00	\$ 367.781	\$ 2.206.686	5,00	83,33%	5,00	\$ 1.838.905,00
2,2	Solado de limpieza en concreto de 2500 PSI para construccion de alcantarillas	m3	9,02	\$ 508.421	\$ 4.585.957	7,00	77,61%	7,00	\$ 3.558.947,00
2,3	Concreto de 3.000 PSI para construccion de Encoles, Descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas	m3	57,46	\$ 671.566	\$ 38.588.182	57,46	100,00%	57,46	\$ 38.588.182,36
2,4	Suministro e instalacion de Acero de Refuerzo PDR 60 para construccion de alcantarillas	kg	425,11	\$ 4.284	\$ 1.821.171	3.923,70	922,98%	3.923,70	\$ 16.809.130,80
2,5	Atraque lateral para alcantarillas en concreto ciclopeo	m3	24,49	\$ 435.320	\$ 10.660.987	27,40	111,88%	27,40	\$ 11.927.768,00
2,6	Suministro e instalacion de Tuberia en concreto f = 36"	ml	70,00	\$ 398.207	\$ 27.874.490	36,00	51,43%	36,00	\$ 14.335.452,00
2,7	Construccion de Filtro Frances de 0.50x0.50 m. con Geotextil NT 2400 y tuberia PVC 100 mm.	ml	800,00	\$ 103.402	\$ 82.721.600	1.396,90	174,61%	1.396,90	\$ 144.442.253,80
2,8	Construccion de Cuneta tipo INVIAS en concreto de 3.000 PSI	ml	800,00	\$ 87.195	\$ 69.756.000	800,00	100,00%	800,00	\$ 69.756.000,00
	SUBTOTAL				\$ 238.215.073		126,46%		\$ 301.256.638,96
	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA								
3,1	Excavacion mecanica en material conglomerado (Incluye transporte)	m3	788,50	\$ 28.691	\$ 22.622.854	0,00	0,00%	0,00	\$ -
3,2	Excavacion Mecanica en material comun (Incluye transporte)	m3	788,50	\$ 20.508	\$ 16.170.558	6.512,00	825,87%	6.512,00	\$ 133.548.096,00
3,3	Conformacion y Compactacion de terraplen con material crudo de rio	m3	2.778,00	\$ 78.151	\$ 217.103.478	2.737,60	98,55%	2.737,60	\$ 213.946.177,60
3,4	Mejoramiento de subrasante con material crudo de rio	m3	483,75	\$ 78.151	\$ 37.805.546	482,00	99,64%	482,00	\$ 37.668.782,00
3,5	Extension, Conformacion y compactacion de Botaderos	m3	1.577,00	\$ 3.604	\$ 5.683.508	6.511,90	412,93%	6.511,90	\$ 23.468.887,60
3,6	Relleno para estructuras con material seleccionado	m3	73,50	\$ 71.319	\$ 5.241.947	278,70	379,18%	278,70	\$ 19.876.605,30
	SUBTOTAL				\$ 304.627.891		140,67%		\$ 428.508.548,50
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
4,1	Suministro, Instalacion y compactacion de Subbase Granular	m3	2.147,00	\$ 112.748	\$ 242.069.956	2.100,10	97,82%	2.100,10	\$ 236.782.074,80
4,2	Suministro, Instalacion y compactacion de Base Granular	m3	1.798,00	\$ 136.714	\$ 245.811.772	1.993,30	110,86%	1.993,30	\$ 272.512.016,20
4,3	Suministro e Instalacion de Emulsion Asfaltica para imprimacion	m2	7.095,00	\$ 3.119	\$ 22.129.305	7.060,70	99,52%	7.060,70	\$ 22.022.323,30
4,4	Suministro, Instalacion y compactacion de Mezcla Asfaltica en caliente MDC-2	m3	719,20	\$ 632.168	\$ 454.655.226	719,20	100,00%	719,20	\$ 454.655.225,60
4,5	Acarreo de Materiales petreos y asfalto	m3-km	277.408,25	\$ 1.439	\$ 399.190.472	240.884,59	86,83%	240.884,59	\$ 346.632.925,01
	SUBTOTAL				\$ 1.363.856.731		97,71%		\$ 1.332.604.564,91



SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

OBJETO:		CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HACIA EL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y "MEJORAMIENTO Y ADECUACION ENTRADA AL MUNICIPIO CRUCE LA ARCADIA TRES ESQUINA Y REHABILITACION DE LOS SECTORES CRITICOS VIA CAMPOALEGRE -ALGECIRAS				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS PALESTINA Y ALGECIRAS		CTO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO	BALANCE FISICO-FINANCIERO AGOSTO DE 2019
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA HUILA 2018					
MUNICIPIO:	PITALITO			INICIAL	\$2.756.345.716,00	
Iniciación	Suspensión	Reinicio	870 DE 2018	10 MESES		
23-May-2018				TOTAL	V.R. TOTAL	
					\$2.756.345.716,00	

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES GENERALES						AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
No.	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PORCENTUAL	CANT.	VALOR
	SEÑALIZACION								
5.1	Suministro e Instalación de Señales de 60 X 60 cm	und	29,00	\$ 352.309	\$ 10.216.961	25,00	86,21%	25,00	\$ 8.807.725,00
5.2	Demarcacion vial con pintura acrilica	m2	4,60	\$ 25.240	\$ 116.104		0,00%	0,00	\$ -
5.3	Suministro e Instalación de Tacha reflectiva para señalización vial	Und	354,00	\$ 9.579	\$ 3.390.966	354,00	100,00%	354,00	\$ 3.390.966,00
5.4	Lineas de demarcacion con pintura acrilica, incluye micro esferas	ml	4.000,00	\$ 2.322	\$ 9.288.000	4.180,00	104,50%	4.180,00	\$ 9.705.960,00
5.5	Suministro e Instalación de estoperol metalico 14 x 4 cm	und	113,00	\$ 20.018	\$ 2.262.034		0,00%	0,00	\$ -
5.6	Suministro, anclaje e Instalación de Defensa metalica	ml	611,00	\$ 221.785	\$ 135.510.635		0,00%	0,00	\$ -
SUBTOTAL					\$ 160.784.700		13,82%		\$ 21.904.651,00
TOTAL					\$ 2.106.029.967				\$ 2.104.874.172
VALOR TOTAL PROYECTO					\$ 2.938.577.592				\$ 2.927.601.772,82

AVANCE FISICO:

99,97%

COSTO DIRECTOS	\$2.106.029.967
AIU = 30%	\$631.808.990
COSTO TOTAL	\$2.737.838.957
VALOR DEL PROYECTO	\$2.938.577.592
COSTO TOTAL OBRA	\$2.737.838.957
VALOR ANTICIPO SUMINISTRADO A CONTRATISTA (50% VALOR CONTRATO)	\$1.368.919.478
VALOR ANTICIPO SUMINISTRADO A INTERVENTORIA	\$57.626.964
ACTAS PARCIALES	\$1.368.919.241
TOTAL RECIBIDO POR EL CONTRATISTA	\$2.737.838.719

ANTICIPO

\$ 1.426.546.443

ACTAS VALOR TOTAL

\$ 1.368.919.241
\$ 2.795.465.683

NOTA: NO SE PUEDEN REPORTAR TODAS LAS CANTIDADES EJECUTADAS POR ITEM'S COPADOS

OSVALDO RUIZ CUELLAR
R.L. CONSORCIO VIAS PALESTINA Y ALGECIRAS
CONTRATISTA

RONALD ALEXIS GONZALEZ
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA HUILA 2018
INTERVENTOR

AVANCE FINANCIERO

99,71%
