



GOBERNACION DEL HUILA

INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD
DEPARTAMENTAL
I SEMESTRE 2015
INFORME No. 1





MIEMBROS DEL OCAD

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	Samuel Zambrano Canizales	Ministerio de Agricultura	Jefe de Planeación y prospectiva	Gobierno Nacional
2	Juan B. Pérez	Ministerio de Minas y Energía	Asesor de despacho	Gobierno Nacional
3	Ramiro Díaz	Gobernación del Huila	Asesor de despacho	Gobierno Departamental
4	Fernando Antonio Pérez	Alcaldía municipio de Tesalia	Alcalde	Gobierno Municipal
5	Lucy Paiva Soto	Alcaldía municipio de Acevedo	Alcaldesa	Gobierno Municipal
6	Orlando Bohorquez	Alcaldía municipio de Suaza	Alcalde	Gobierno Municipal
7	Alexander Martínez Ballesteros	Alcaldía municipio de Algeciras	Alcalde	Gobierno Municipal

SECRETARIO TÉCNICO DEL OCAD: Dra. Sonia Mora Orrego

PERIODO DE INFORME REPORTADO

Primer semestre año 2015



INFLEXIBILIDADES

	2015
Servicio Deuda Publica	\$ 8.410.676.494
Acuerdo de pago Resguardo Indígena Páez de Baché	\$ 522.537.976
Plan Departamental de Agua	\$ 8.977.180.000
TOTAL	\$ 17.910.394.470
Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No. 1 DE 6/02/15

TOTAL DE ASIGNACIONES DEPARTAMENTO DEL HUILA



DEPARTAMENTO HUILA		ASIGNACIONES DIRECTAS	FONPET	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 22.466.797.391,00		
Apropiación LEY 1744		\$ 59.092.592.810,00	\$ 23.897.220.540,83	\$ 59.092.592.810,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	70%	\$ 41.364.814.967,00		\$ 41.364.814.967,00
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744		\$ 12.873.219.878,00		\$ 12.873.219.878,00
Desahorro 10% FAE Ley 1744		\$ 10.486.770.181,00		\$ 10.486.770.181,00
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	50%	\$ 32.362.402.513,00		\$ 32.362.402.513,00
saldo de mayor recaudo 2012 (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 24.139.455.111,54		\$ 24.139.455.111,54
Compensación 724 de 2015		\$ 15.031.202.182,00		\$ 15.031.202.182,00
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas		\$ 29.353.321.269,82		\$ 29.353.321.269,82
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014		\$ 18.074.345.141,00		\$ 18.074.345.141,00
				\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 141.427.523.608,36	\$ 23.897.220.540,83	\$ 165.324.744.149,19
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS		\$ -		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015		\$ -		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS		\$ 9.795.576.942,00		
TOTAL		\$ 151.223.100.550,39		\$ 151.223.100.550,39
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(-) Aprobacion del I semestre 2015		\$ 48.462.437.635,00	\$ -	\$ -
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 103.260.662.915,00		
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		32%		



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE TERUEL



TERUEL		FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 169.292.347,21	
Apropiación LEY 1744		\$ 986.731.799,00	\$ 986.731.799,00
Aplazamiento en Asignacion ley 1744	70%	\$ 690.712.259,30	\$ 690.712.259,30
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744			\$ -
Desahorro 10% FAE Ley 1744			\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ 345.356.129,65	\$ 345.356.129,65
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 38.468.706,12	\$ 38.468.706,12
Compensación 724 de 2015			\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas			\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014			\$ -
			\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 553.117.182,98	\$ 553.117.182,98
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS			
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015			
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS			
TOTAL DISPONIBLE		\$ 553.117.182,98	\$ 553.117.182,98
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015		\$ 270.447.568,00	\$ 270.447.568,00
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 282.669.614,98	\$ 282.669.614,98
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		49%	49%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE GIGANTE



GIGANTE		ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 883.634.277,85	\$ (37.998.686,62)	
Apropiación LEY 1744		\$ 289.555.434,00	\$ 2.110.139.307,00	\$ 2.399.694.741,00
Aplazamiento en Asignación ley 1744	70%	\$ 202.688.803,80	\$ 1.477.097.514,90	\$ 1.679.786.318,70
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744		\$ 63.079.154,02		\$ 63.079.154,02
Desahorro 10% FAE Ley 1744		\$ -		\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ 132.883.978,91	\$ 738.548.757,45	\$ 871.432.736,36
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 151.155.501,04	\$ 81.471.818,30	\$ 232.627.319,34
Compensación 724 de 2015		\$ 112.274.617,00		\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas		\$ 279.348.110,00		\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014		\$ -		\$ -
				\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 1.167.673.757,80	\$ 782.021.889,13	\$ 1.949.695.646,93
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS		\$ -		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015		\$ 226.373.751,00		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS		\$ 1.534.560,69		
TOTAL DISPONIBLE		\$ 1.787.204.796,49	\$ 782.021.889,13	\$ 2.289.878.575,62
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(-) Aprobacion del I semestre 2015		\$ -	\$ 361.649.100,00	\$ 361.649.100,00
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 1.787.204.796,49	\$ 420.372.789,13	\$ 1.926.694.914,93
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		0,00%	46%	16%

TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE EL AGRADO



EL AGRADO		ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 4.852.499,74	\$ 141.231.548,23	
Apropiación LEY 1744		\$ 10.161.806,00	\$ 839.059.800,00	\$ 849.221.606,00
Aplazamiento en Asignacion ley 1744	70%	\$ 5.080.903,22	\$ 587.341.860,00	\$ 594.455.124,20
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744		\$ 1.106.866,04		\$ 2.213.732,00
Desahorro 10% FAE Ley 1744		\$ -		\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ 4.663.498,10	\$ 293.670.930,00	\$ 298.334.428,10
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 370.628,04	\$ 32.365.946,04	\$ 32.736.574,08
Compensación 724 de 2015		\$ -		\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas		\$ -		\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014		\$ -		\$ -
				\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 11.410.896,78	\$ 467.268.424,27	\$ 474.814.153,76
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS		\$ -		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015		\$ -		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS		\$ -		
TOTAL DISPONIBLE		\$ 11.410.896,78	\$ 467.268.424,27	\$ 474.814.153,76
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(-) Aprobacion del I semestre 2015		\$ -	\$ 257.000.000,00	\$ 257.000.000,00
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 11.410.896,78	\$ 210.268.424,27	\$ 217.814.153,76
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		0,00%	55%	54%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE ALGECIRAS



ALGECIRAS		FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 382.058.619,13	
Apropiación LEY 1744		\$ 2.264.834.355,00	\$ 2.264.834.355,00
Aplazamiento en Asignacion ley 1744	70%	\$ 1.585.384.048,50	\$ 1.585.384.048,50
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744			\$ -
Desahorro 10% FAE Ley 1744			\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ 792.692.024,25	\$ 792.692.024,25
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 87.800.125,56	\$ 87.800.125,56
Compensación 724 de 2015			\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas			\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014			\$ -
			\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 1.262.550.768,94	\$ 1.262.550.768,94
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS			
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015			
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS			
TOTAL DISPONIBLE		\$ 1.262.550.768,94	\$ 1.262.550.768,94
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015		\$ -	\$ -
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 1.262.550.768,94	\$ 1.262.550.768,94
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		0,00%	0,00%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE



CAMPOALEGRE		FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 510.142.912,62	
Apropiación LEY 1744		\$ 2.022.740.037,00	\$ 2.022.740.037,00
Aplazamiento en Asignacion ley 1744	70%	\$ 1.415.918.025,90	\$ 1.415.918.025,90
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744			\$ -
Desahorro 10% FAE Ley 1744			\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ 707.959.012,95	\$ 707.959.012,95
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 78.909.495,55	\$ 78.909.495,55
Compensación 724 de 2015			\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas			\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014			\$ -
			\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 1.297.011.421,12	\$ 1.297.011.421,12
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS			
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015			
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS			
TOTAL DISPONIBLE		\$ 1.297.011.421,12	\$ 1.297.011.421,12
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015		\$ 1.103.550.000,00	\$ 1.103.550.000,00
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 193.461.421,12	\$ 193.461.421,12
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		85%	85%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE COLOMBIA



COLOMBIA		FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 343.603.973,27	
Apropiación LEY 1744		\$ 1.151.841.981,00	\$ 1.151.841.981,00
Aplazamiento en Asignacion ley 1744	70%	\$ 806.289.386,70	\$ 806.289.386,70
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744			\$ -
Desahorro 10% FAE Ley 1744			\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ 403.144.693,35	\$ 403.144.693,35
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 44.179.749,84	\$ 44.179.749,84
Compensación 724 de 2015			\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas			\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014			\$ -
			\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 790.928.416,46	\$ 790.928.416,46
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS			
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015			
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS			
TOTAL DISPONIBLE		\$ 790.928.416,46	\$ 790.928.416,46
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015		\$ -	\$ -
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 790.928.416,46	\$ 790.928.416,46
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		0%	0%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE IQUIRA



IQUIRA		ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 29.025.888,39	\$ 174.104.354,53	
Apropiación LEY 1744		\$ 13.879.568,00	\$ 1.186.268.489,00	\$ 1.200.148.057,00
Aplazamiento en Asignación ley 1744	70%	\$ 6.939.784,50	\$ 830.387.942,30	\$ 840.103.639,90
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744		\$ 3.023.640,00		\$ 3.023.640,00
Desahorro 10% FAE Ley 1744		\$ -		\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ 6.369.668,80	\$ 415.193.971,15	\$ 421.563.639,95
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 862.980,54	\$ 44.982.140,08	\$ 45.845.120,62
Compensación 724 de 2015		\$ -		\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas		\$ -		\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014		\$ -		\$ -
				\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 45.944.421,90	\$ 634.280.465,76	\$ 670.539.003,49
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS		\$ -		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015		\$ -		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS		\$ 3.756.348,00		
TOTAL DISPONIBLE		\$ 49.700.769,90	\$ 634.280.465,76	\$ 674.295.351,49
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(-) Aprobación del I semestre 2015		\$ -	\$ 206.088.312,00	\$ 206.088.312,00
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 49.700.769,90	\$ 428.192.153,76	\$ 464.450.691,49
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		0,00%	32%	31%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE NATAGA



NATAGA		FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 192.998.256,79	
Apropiación LEY 1744		\$ 587.579.797,00	\$ 587.579.797,00
Aplazamiento en Asignacion ley 1744	70%	\$ 411.305.857,90	\$ 411.305.857,90
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744			\$ -
Desahorro 10% FAE Ley 1744			\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ 205.652.928,95	\$ 205.652.928,95
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 22.592.331,72	\$ 22.592.331,72
Compensación 724 de 2015			\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas			\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014			\$ -
			\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 421.243.517,46	\$ 421.243.517,46
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS			
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015			
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS			
TOTAL DISPONIBLE		\$ 421.243.517,46	\$ 421.243.517,46
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015		\$ -	\$ -
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 421.243.517,46	\$ 421.243.517,46
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		0,00%	0,00%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE PALESTINA



PALESTINA		FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 6.854.403,45	
Apropiación LEY 1744		\$ 1.073.631.560,00	\$ 1.073.631.560,00
Aplazamiento en Asignación ley 1744	70%	\$ 751.542.092,00	\$ 751.542.092,00
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744			\$ -
Desahorro 10% FAE Ley 1744			\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ 375.771.046,00	\$ 375.771.046,00
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 41.077.528,75	\$ 41.077.528,75
Compensación 724 de 2015			\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas			\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014			\$ -
			\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 423.702.978,20	\$ 423.702.978,20
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS			
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015			
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS			
TOTAL DISPONIBLE		\$ 423.702.978,20	\$ 423.702.978,20
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobación del I semestre 2015		\$ -	\$ -
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 423.702.978,20	\$ 423.702.978,20
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		0,00%	0,00%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO EL PITAL



EL PITAL		FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ (12.284.710,46)	
Apropiación LEY 1744		\$ 1.267.637.419,00	\$ 1.267.637.419,00
Aplazamiento en Asignación ley 1744	70%	\$ 887.346.193,30	\$ 887.346.193,30
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744			\$ -
Desahorro 10% FAE Ley 1744			\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ 443.673.096,65	\$ 443.673.096,65
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 48.855.250,73	\$ 48.855.250,73
Compensación 724 de 2015			\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas			\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014			\$ -
			\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 480.243.636,92	\$ 480.243.636,92
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS			
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015			
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS			
TOTAL DISPONIBLE		\$ 480.243.636,92	\$ 480.243.636,92
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015		\$ -	\$ -
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 480.243.636,92	\$ 480.243.636,92
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		0,00%	0,00%

TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE RIVERA



RIVERA		ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 813.912,29	\$ 585.828.313,30	
Apropiación LEY 1744		\$ 820.588,22	\$ 1.524.998.427,00	\$ 1.525.819.015,22
Aplazamiento en Asignacion ley 1744	70%	\$ 574.411,75	\$ 1.067.498.898,90	\$ 1.068.073.310,65
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744		\$ 125.135,00		\$ 125.135,00
Desahorro 10% FAE Ley 1744		\$ -		\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ 349.773,38	\$ 533.749.449,45	\$ 534.099.222,83
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 500.449,41	\$ 59.175.683,96	\$ 59.676.133,37
Compensación 724 de 2015		\$ -		\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas		\$ -		\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014		\$ -		\$ -
				\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 1.664.135,08	\$ 1.178.753.446,71	\$ 1.180.417.581,79
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS		\$ -		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015		\$ -		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS		\$ -		
TOTAL DISPONIBLE		\$ 1.664.135,08	\$ 1.178.753.446,71	\$ 1.180.417.581,79
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(-) Aprobacion del I semestre 2015		\$ -	\$ -	\$ -
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 1.664.135,08	\$ 1.178.753.446,71	\$ 1.180.417.581,79
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		0,00%	0,00%	0,00%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE SANTA MARIA



SANTA MARIA		ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 610.438,50	\$ 177.698.886,48	
Apropiación LEY 1744		\$ 190.042,00	\$ 1.052.535.898,00	\$ 1.052.725.940,00
Aplazamiento en Asignacion ley 1744	70%	\$ 133.029,40	\$ 736.775.128,60	\$ 736.908.158,00
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744		\$ 41.400,00		\$ 41.400,00
Desahorro 10% FAE Ley 1744		\$ -		\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ 95.020,91	\$ 368.387.564,30	\$ 368.474.779,00
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 500.449,41	\$ 40.416.885,42	\$ 40.917.334,83
Compensación 724 de 2015		\$ -		\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas		\$ -		\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014		\$ -		\$ -
				\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 1.336.598,05	\$ 586.503.336,20	\$ 587.701.438,81
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS		\$ -		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015		\$ -		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS		\$ -		
TOTAL DISPONIBLE		\$ 1.336.598,05	\$ 586.503.336,20	
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(-) Aprobacion del I semestre 2015		\$ -	\$ 676.633.102,00	\$ 676.633.102,00
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 1.336.598,05	\$ (90.129.765,80)	\$ (88.931.663,19)
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		0,00%	115%	0,00%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE TARQUI



TARQUI		ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 6.408,98	\$ 400.440.827,39	
Apropiación LEY 1744		\$ -	\$ 1.632.820.183,00	\$ 1.632.820.183,00
Aplazamiento en Asignacion ley 1744	70%	\$ -	\$ 1.142.974.128,10	\$ 1.142.974.128,10
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744		\$ -		\$ -
Desahorro 10% FAE Ley 1744		\$ -		\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ -	\$ 571.487.064,05	\$ 571.487.064,05
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ -	\$ 62.664.620,74	\$ 62.664.620,74
Compensación 724 de 2015		\$ 855,21	\$ 855,00	\$ 1.710,00
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas		\$ 1.760,00		\$ 1.760,00
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014		\$ -		\$ -
				\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 9.023,98	\$ 1.034.593.367,18	\$ 1.034.602.391,16
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS		\$ -		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015		\$ -		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS		\$ 67.098.431,01		
TOTAL DISPONIBLE		\$ 67.107.454,99	\$ 1.034.593.367,18	\$ 1.101.700.822,17
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(-) Aprobacion del I semestre 2015		\$ -	\$ 730.725.672,00	\$ 730.725.672,00
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 7.264,19	\$ 303.867.695,18	\$ 303.874.959,16
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		0,00%	71%	66%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE ELIAS



ELIAS		FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 4.971.241,41	
Apropiación LEY 1744		\$ 604.015.813,00	\$ 604.015.813,00
Aplazamiento en Asignacion ley 1744	70%	\$ 422.811.069,10	\$ 422.811.069,10
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744			\$ -
Desahorro 10% FAE Ley 1744			\$ -
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)		\$ 211.405.534,55	\$ 211.405.534,55
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 23.327.238,48	\$ 23.327.238,48
Compensación 724 de 2015		\$ -	\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas			\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014			\$ -
			\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 239.704.014,44	\$ 239.704.014,44
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS			
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015			
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS			
TOTAL DISPONIBLE		\$ 239.704.014,44	\$ 239.704.014,44
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015		\$ 153.348.271,00	\$ 153.348.271,00
(+) liberaciones de I semestre 2015		\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 86.355.743,44	\$ 86.355.743,44
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		64%	64%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE TELLO



TELLO		ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		\$ 609.103,96	\$ 102.780.948,63	
Apropiación LEY 1744		\$ 47.912,00	\$ 1.314.315.152,00	\$ 1.314.363.064,00
Aplazamiento en Asignacion ley 1744	70%	\$ 33.538,40	\$ 920.020.606,40	\$ 920.054.144,80
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744		\$ 10.438,00		\$ 10.438,00
Desahorro 10% FAE Ley 1744		\$ 288.750,00		\$ 288.750,00
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	50%	\$ 166.363,20	\$ 460.010.303,20	\$ 460.176.666,40
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)		\$ 214.583,46	\$ 50.743.813,29	\$ 50.958.396,75
Compensación 724 de 2015		\$ -	\$ -	\$ -
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas		\$ -		\$ -
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014		\$ -		\$ -
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		\$ 990.050,62	\$ 613.535.065,12	\$ 614.525.115,74
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS		0,00		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015		0		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS		0		
TOTAL DISPONIBLE		\$ 990.050,62	\$ 613.535.065,12	\$ 614.525.115,74
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(-) Aprobacion del I semestre 2015			\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00
(+) liberaciones de I semestre 2015		0	\$ -	\$ -
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 JUNIO 2015		\$ 990.050,62	\$ 580.535.065,12	\$ 581.525.115,74
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE JUNIO 2015		0,00%	5%	5%




DISTRIBUCION POR SECTOR DE INVERSION DE PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



SECTOR	NUMERO DE PROYECTOS APROBADOS POR SECTOR	% NUMERO DE PROYECTOS APROBADOS POR SECTOR	MONTO ASIGNADO	% FUENTE SGR	% OTRAS FUENTES DE FINANCIACION
Educación	2	7%	\$ 1.606.938.147,00	87%	13%
Agricultura	1	3%	\$ 2.288.907.139,00	100%	0%
Comercio, Industria y Turismo	1	3%	\$ 1.817.200.000,00	100%	0%
Cultura	1	3%	\$ 390.001.915,00	100%	0%
Deporte	2	7%	\$ 2.193.618.315,00	100%	0%
Medio Ambiente y Riesgo	1	3%	\$ 465.000.000,00	100%	0%
Salud	1	3%	\$ 2.000.000.000,00	20%	80%
Transporte	6	20%	\$ 7.994.211.306,00	96%	4%
Vivienda y Desarrollo Urbano	15	50%	\$ 41.315.958.663,00	22%	78%
TOTAL	30	100%	\$ 60.071.835.485,00		




DISTRIBUCION POR SECTOR DE INVERSION

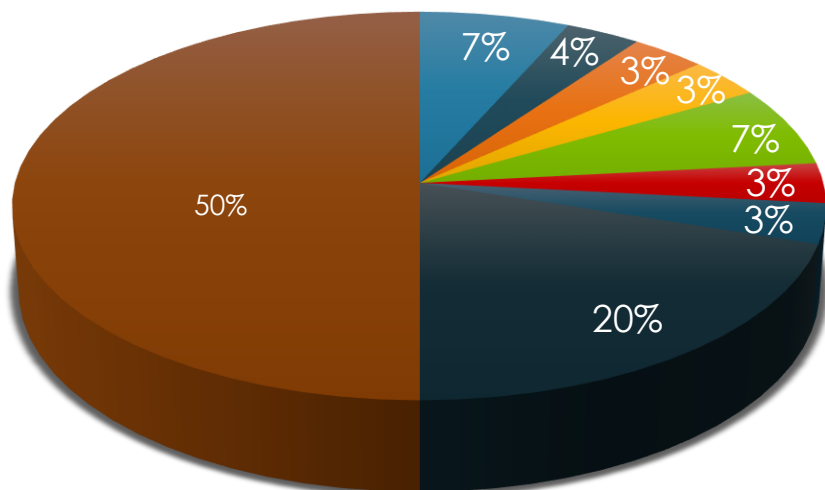

- Educación
- Comercio, Industria y Turismo
- Deporte
- Salud
- Vivienda y Desarrollo Urbano
- Agricultura
- Cultura
- Medio Ambiente y Riesgo
- Transporte

PORCENTAJE POR TIPO DE FUENTE DE FINANCIACION

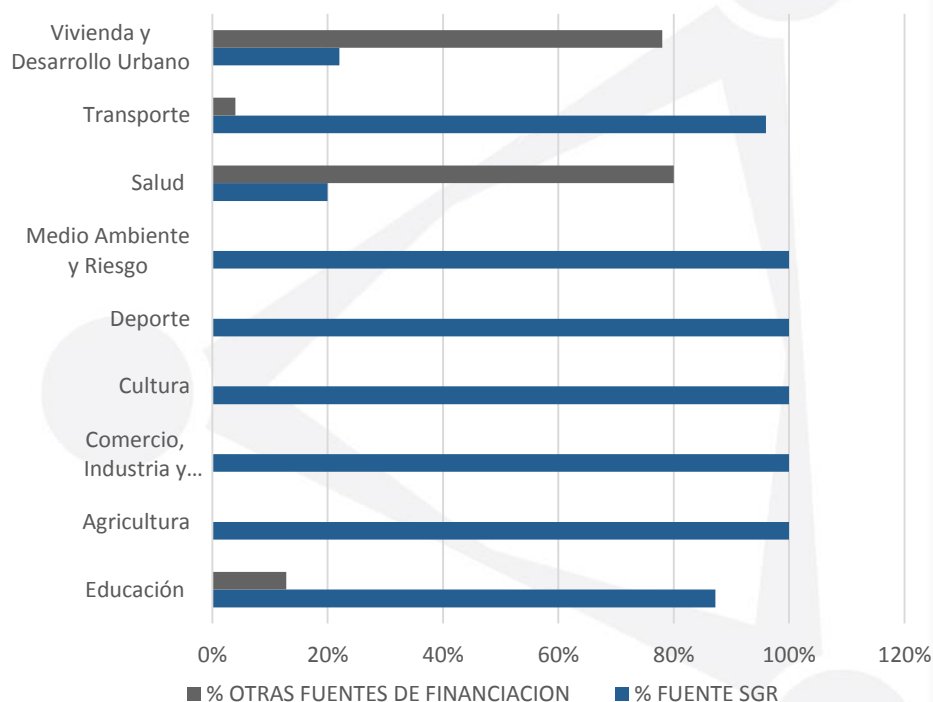

PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 1 REHABILITACIÓN DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE ARTE EN LA RED Terciaria DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código BPIN	20140004410069
Sector	Transporte-Vial Red Terciaria
Valor Total	\$ 726.633.102,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 676.633.102,00
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	115,37%
Otras fuentes (discriminar)	\$50 Millones de recursos Propios Municipio de Santa María
Tiempo de ejecución	6 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	Municipio de Santa María
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	Municipio de Santa María
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 02 DEL 04/03/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 12 de Marzo de 2015

IMPACTO: Con la ejecución del proyecto se impacta el indicador Transporte Kilómetros de vías priorizadas del Plan de desarrollo Nacional, se contribuye a la rehabilitación de la red terciaria para mejorar la movilidad, el desarrollo económico y social de la población rural de los municipios del Plan de Desarrollo Departamental y el programa Vías para el Desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal Porque todos merecemos vivir mejor.

PERTINENCIA: Se requiere de este proyecto para mejorar la movilidad de carga y pasajeros, disminuir el riesgo de accidentes y contribuir al aumento de la productividad pues actualmente la vía se encuentra destapada sin pavimento y con una serie de puntos críticos con altas pendientes los cuales imposibilitan el tránsito en temporadas de oleada invernal.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 2 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA REUBICACION DE LA SEDE ALTO BUENAVISTA DEL CENTRO EDUCATIVO BUENAVISTA MUNICIPIO EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA



Código BPIN	2014004410064
Sector	Educación - Preescolar y Básica y Media
Valor Total	\$ 522.139.515,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 469.925.563,00
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,33%
Otras fuentes (discriminar)	\$52.213.952 Recursos Propios Municipio del Agrado
Tiempo de ejecución	6 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	Municipio del Agrado
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	Municipio del Agrado
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 02 DEL 04/03/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 06 de Marzo de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Educación Centros regionales de innovación educativa implementados, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye a mejorar la calidad de los servicios que ofrece el departamento en las instituciones educativas y al programa educación integral Agrado del Plan de Desarrollo Municipal AGRADO UNIDO CONSTRUYENDO FUTURO.

PERTINENCIA: El proyecto mejora las condiciones para cubrir las necesidades que en materia educativa se presentan en el territorio municipal, garantizando una infraestructura para cerca de 80 menores entre niños y niñas, que asisten a este establecimiento educativo el cual requiere ser reubicado por el riesgo que representa el terreno en donde está construida actualmente.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 3 MEJORAMIENTO DE 180 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA

Código BPIN	2014004410048
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda rural
Valor Total	540.000.000
Solicitud de recursos del SGR	540.000.000
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,17%
Otras fuentes (discriminar)	\$0
Tiempo de ejecución	5 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE COLOMBIA
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	MUNICIPIO DE COLOMBIA
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 03 DEL 13/04/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 11 de Mayo de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda Número de viviendas iniciadas por Macroproyectos, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye a Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiadas en la zona rural y al programa Unidos por unas viviendas dignas del Plan de Desarrollo Municipal UNIDOS POR UNA COLOMBIA MEJOR.

PERTINENCIA: El proyecto contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de un número importante de familias del sector rural que actualmente no cuenta con una vivienda digna en el municipio y que viven hacinadas.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 4 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN 13 SEDES DE LA NUEVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código BPIN	2014004410044
Sector	Educación - Preescolar y Básica y Media
Valor Total	\$ 1.084.798.632,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 931.376.763,14
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,40% DEPARTAMENTO 46,25% MUNICIPIO
Otras fuentes (discriminar)	\$ 153.421.868,86
Tiempo de ejecución	11 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE GIGANTE
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	MUNICIPIO DE GIGANTE
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 03 DEL 13/04/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 06 de Mayo de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Educación - Número de ambientes educativos especializados y pertinentes construidos, para la atención integral de niñas y niños menores de 5 años, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye a Mejorar la infraestructura educativa logrando atender una mayor demanda de estudiantes en el departamento y al programa Cobertura y Fortalecimiento educativo del Plan de Desarrollo Municipal Por un Gigante mejor y para todos.

PERTINENCIA: El proyecto aporta al buen desarrollo educativo de los estudiantes del municipio de Gigante, teniendo en cuenta que soluciona el deterioro en la Infraestructura de 13 instituciones educativas.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015




Proyecto No. 5 CONSTRUCCION OBRAS DE RECREACION Y SANO ESPARCIMIENTO EN EL MALECON SOBRE LA QUEBRADA CHIBAYACO ZONA URBANA MUNICIPIO DE EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código BPIN	2014004410053
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Valor Total	\$ 1.252.169.295,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 1.252.169.295,00
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,70% DEPARTAMENTO 55% MUNICIPIO
Otras fuentes (discriminar)	\$0
Tiempo de ejecución	6 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DEL AGRADO
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	MUNICIPIO DEL AGRADO
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 05 DEL 12/05/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 18 de Agosto de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación - Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye a propiciar condiciones óptimas para el disfrute de tiempo libre y esparcimiento de recreación, cultural y deportiva. También al programa Construcción y mejoramiento de Infraestructura deportiva y recreativa del Plan de Desarrollo Municipal Agrado Unido Construyendo Futuro.

PERTINENCIA: El proyecto ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Agrado disminuyendo los índices de insalubridad como la obesidad y problemas cardiovasculares a través de la práctica de deporte y recreación en sitios adecuados, seguros e iluminados.

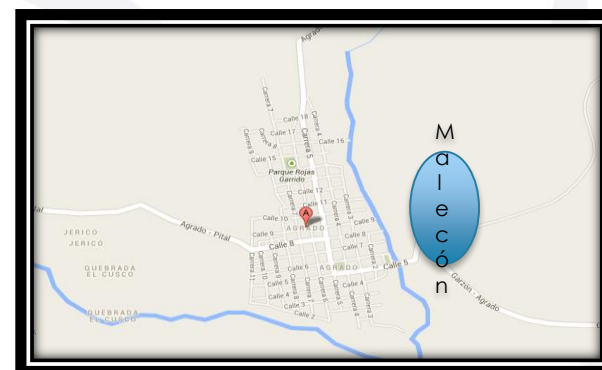

PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 6 DISEÑO Y EJECUCION DE UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL COMO DESTINO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código BPIN	2014004410005
Sector	Comercio, Industria y Turismo - Fondo del Turismo
Valor Total	\$ 1.817.200.000,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 1.817.200.000,00
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	1,28%
Otras fuentes (discriminar)	\$0
Tiempo de ejecución	12 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 05 DEL 12/05/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 18 de Junio de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Comercio - Ocupación Hotelera, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental logra fomentar la promoción turística en el Departamento, orientada a promover los destinos en los mercados nacionales e internacionales.

PERTINENCIA: Este proyecto aumenta el nivel de promoción turística del Departamento del Huila a través de la divulgación de los destinos turísticos a nivel regional para recuperar el posicionamiento del Huila como destino Turístico.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 7 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VISR GRUPO ASOPROBAN MUNICIPIO DE TELLO, HUILA.

Código BPIN	2015004410016
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda rural
Valor Total	\$ 440.709.673,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 115.461.673,00
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,06%
Otras fuentes (discriminar)	\$ 325.248.000,00 APOORTE NACION
Tiempo de ejecución	8 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	BANCO AGRARIO
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	BANCO AGRARIO
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 05 DEL 12/05/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Sin certificado, Pendiente por parte del DNP del concepto para realizar el ajuste al proyecto para solucionar la petición del banco agrario quien solicitó un 3% para administración de los recursos como ejecutor

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda - Número de hectáreas habilitadas de suelo para vivienda, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye a mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiadas en la zona rural. También al programa promoción de vivienda de interés social del Plan de Desarrollo Municipal EN TELLO TODOS PODEMOS.

PERTINENCIA: El proyecto mejora las condiciones de vivienda de 33 familias de la zona rural del Municipio de Tello las cuales se encuentran en deficientes condiciones de habitabilidad.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 8. CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "JUNTOS CONSTRUYENDO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL 2014 PARA EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE

Código BPIN	2015004410015
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda rural
Valor Total	\$ 600.967.735,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 112.447.735,00
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,08%
Otras fuentes (discriminar)	\$45.000.000 Municipio de Palermo y \$443.520.000 Banco Agrario
Tiempo de ejecución	8 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	Banco Agrario
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	Banco Agrario
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 05 DEL 12/05/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Sin certificado, Pendiente por parte del DNP del concepto para realizar el ajuste al proyecto para solucionar la petición del banco agrario quien solicitó un 3% para administración de los recursos como ejecutor

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda - Número de Macroproyectos en ejecución, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental concurrir a la financiación en el mejoramiento de viviendas, mediante la asignación de subsidios. También al programa Juntos Construyendo Vivienda Social del Plan de Desarrollo Municipal Palermo por su transformación Social.

PERTINENCIA: El proyecto mejora las condiciones de vivienda de familias de la zona rural del Municipio de Palermo, las cuales se encuentran en deficientes condiciones de habitabilidad.





PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 9. CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "60 SOLUCIONES DE MEJORAMIENTOS RURALES II DE LAS AGREMIACIONES" DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA

Código BPIN	2015004410014
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda rural
Valor Total	\$ 681.096.950,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 178.440.950,00
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,09%
Otras fuentes (discriminar)	\$ 502.656.000,00 Nación Ministerio de Agricultura
Tiempo de ejecución	8 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	Banco Agrario
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	Banco Agrario
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 05 DEL 12/05/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Sin certificado, Pendiente por parte del DNP del concepto para realizar el ajuste al proyecto para solucionar la petición del banco agrario quien solicitó un 3% para administración de los recursos como ejecutor

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda - Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de saneamiento, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiadas en la zona rural. También al programa vivienda y espacio público del Plan de Desarrollo Municipal VILLAVIEJA UNIDOS POR EL CAMPO.

PERTINENCIA: El proyecto mejora las condiciones de vivienda de familias de la zona rural del Municipio de Villavieja, las cuales se encuentran en deficientes condiciones de habitabilidad.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 10. CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "60 SOLUCIONES DE MEJORAMIENTOS RURALES I DE LAS AGREMIACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA

Código BPIN	2015004410013
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda rural
Valor Total	\$ 173.612.752,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 45.484.752,00
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,02%
Otras fuentes (discriminar)	\$ 128.128.000,00 Nación Ministerio de Agricultura
Tiempo de ejecución	8 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	Banco Agrario
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	Banco Agrario
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 05 DEL 12/05/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Sin certificado, Pendiente por parte del DNP del concepto para realizar el ajuste al proyecto para solucionar la petición del banco agrario quien solicitó un 3% para administración de los recursos como ejecutor

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda - Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de saneamiento, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiadas en la zona rural. También al programa vivienda y espacio público del Plan de Desarrollo Municipal VILLAVIEJA UNIDOS POR EL CAMPO.

PERTINENCIA: El proyecto mejora las condiciones de vivienda de familias de la zona rural del Municipio de Villavieja, las cuales se encuentran en deficientes condiciones de habitabilidad.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 11. MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 48 VISR 2014 SUAZA FASE 4

Código BPIN	2015004410012
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda rural
Valor Total	\$ 467.419.350,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 122.459.350,00
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,06%
Otras fuentes (discriminar)	\$ 344.960.000,00 Nación Ministerio de Agricultura
Tiempo de ejecución	8 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	Banco Agrario
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	Banco Agrario
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0% ACUERDO 05 DEL 12/05/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Sin certificado, Pendiente por parte del DNP del concepto para realizar el ajuste al proyecto para solucionar la petición del banco agrario quien solicitó un 3% para administración de los recursos como ejecutor

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda - Número de hectáreas habilitadas de suelo para vivienda, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiadas en la zona rural. También el programa vivienda digna para los Suaceños del Plan de Desarrollo Municipal UNIDOS CONSTRUIMOS DESARROLLO.

PERTINENCIA: El proyecto mejora las condiciones de vivienda de familias de la zona rural del Municipio de Suaza, las cuales se encuentran en deficientes condiciones de habitabilidad.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 12. MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 60 VISR 2014 SUAZA FASE 2

Código BPIN	2015004410011
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda rural
Valor Total	\$ 654.387.284,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 171.443.284,00
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,09%
Otras fuentes (discriminar)	\$ 482.944.000,00 Nación Ministerio de Agricultura
Tiempo de ejecución	8 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	Banco Agrario
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	Banco Agrario
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 05 DEL 12/05/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Sin certificado, Pendiente por parte del DNP del concepto para realizar el ajuste al proyecto para solucionar la petición del banco agrario quien solicitó un 3% para administración de los recursos como ejecutor

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda - Número de hectáreas habilitadas de suelo para vivienda, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiadas en la zona rural. También el programa vivienda digna para los Suaceños del Plan de Desarrollo Municipal UNIDOS CONSTRUIMOS DESARROLLO.

PERTINENCIA: El proyecto mejora las condiciones de vivienda de familias de la zona rural del Municipio de Suaza, las cuales se encuentran en deficientes condiciones de habitabilidad.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 13. MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO 60 VISR 2014 SUAZA FASE 1

Código BPIN	2015004410010
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda rural
Valor Total	\$ 654.387.284,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 171.443.284,00
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,09%
Otras fuentes (discriminar)	\$ 482.944.000,00 Nación Ministerio de Agricultura
Tiempo de ejecución	8 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	Banco Agrario
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	Banco Agrario
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 05 DEL 12/05/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Sin certificado, Pendiente por parte del DNP del concepto para realizar el ajuste al proyecto para solucionar la petición del banco agrario quien solicitó un 3% para administración de los recursos como ejecutor

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda - Número de hectáreas habilitadas de suelo para vivienda, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiadas en la zona rural. También el programa vivienda digna para los Suaceños del Plan de Desarrollo Municipal UNIDOS CONSTRUIMOS DESARROLLO.

PERTINENCIA: El proyecto mejora las condiciones de vivienda de familias de la zona rural del Municipio de Suaza, las cuales se encuentran en deficientes condiciones de habitabilidad.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 14. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DE LA ASOCIACION DE CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA

Código BPIN	2015004410009
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda rural
Valor Total	\$ 574.258.058,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 107.450.058,00
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,08%
Otras fuentes (discriminar)	\$ 423.808.000,00 Nación Ministerio de Agricultura \$ 43.000.000,00 Recursos Propios Municipio de Iquira
Tiempo de ejecución	8 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	Banco Agrario
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	Banco Agrario
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 05 DEL 12/05/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Sin certificado, Pendiente por parte del DNP del concepto para realizar el ajuste al proyecto para solucionar la petición del banco agrario quien solicitó un 3% para administración de los recursos como ejecutor

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda - Número total de viviendas iniciadas, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiadas en la zona rural. También el programa una vivienda digna para Iquira del Plan de Desarrollo Municipal POR UN IQUIRA ORGANIZADO, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO.

PERTINENCIA: El proyecto mejora las condiciones de vivienda 43 de familias de la zona rural del Municipio de Iquira, las cuales se encuentran en deficientes condiciones de habitabilidad.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 15. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EVENTOS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA.

Código BPIN	2015004410005
Sector	Medio Ambiente y Riesgo - Atención de desastres
Valor Total	\$ 465.000.000,00
Solicitud de recursos del SGR	\$ 465.000.000,00
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	35,85%
Otras fuentes (discriminar)	\$0
Tiempo de ejecución	3 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	NA
Estado de ejecución	Fecha de corte del reporte de GESPROY: 07/09/2015 AVANCE FISICO 0%
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO 06 DEL 09/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 23 de Junio de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Defensa - Atención efectiva en situaciones catastróficas, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental Apoyo en la atención de los requerimientos de asistencia técnica y gestión local del riesgo en el Departamento. También el programa Buen Gobierno del Plan de Desarrollo Municipal De Corazón por Campoalegre.

PERTINENCIA: El proyecto a través de la compra de un vehículo aumenta la capacidad de respuesta del municipio de Campoalegre para la atención de incendios en el área de su jurisdicción, evitando o disminuyendo posibles pérdidas tanto en vidas humanas como en recursos.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 16 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL DIAMANTE 2 DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA - HUILA

Código BPIN	2015004410002
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Agua potable y saneamiento básico
Valor Total	\$ 542,611,951
Solicitud de recursos del SGR	\$ 542,611,951
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,38%
Otras fuentes	\$ 0
Tiempo de ejecución	4 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% Fuente Mapa regalías 07/09/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.006 DE 2015 09/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Sin certificado, pendiente expedición de certificación de la CAM

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de acueducto, en cuanto a las metas Departamentales contribuye en la ampliación de sistemas de Acueducto en la zona rural del Departamento y al programa unidos por mejorar los servicios públicos de Colombia del Plan de Desarrollo Municipal UNIDOS POR UNA COLOMBIA MEJOR.

PERTINENCIA: La ejecución del proyecto aborda el problema del sistema de acueducto Diamante 2 existente de la Vereda El Diamante, el cual presenta deterioro, problema de fugas, tubería deflectada, pandeo, y no presta el servicio de agua potable a la totalidad de la comunidad, ocasionando que las familias presenten síntomas gastrointestinales.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015




Proyecto No. 17 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL DIAMANTE 1 DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA – HUILA

Código BPIN	2015004410001
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Agua potable y saneamiento básico
Valor Total	\$ 439,035,344
Solicitud de recursos del SGR	\$ 439,035,344
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,31%
Otras fuentes	\$ 0
Tiempo de ejecución	4 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% FUENTE: Mapa regalías 07/09/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.006 DE 2015 09/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Sin certificado, pendiente expedición de certificación de la CAM

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de acueducto, en cuanto a las metas Departamentales contribuye en la ampliación de sistemas de Acueducto en la zona rural del Departamento y al programa unidos por mejorar los servicios públicos de Colombia del Plan de Desarrollo Municipal UNIDOS POR UNA COLOMBIA MEJOR.

PERTINENCIA: La ejecución del proyecto mejora la calidad de vida de 30 familias residentes en la Vereda El Diamante que no cuentan con el servicio de agua potable , pues se abastecen de pequeñas corrientes cercanas sin tratamiento, expuestos a enfermedades gastrointestinales generando problemas de salud pública.

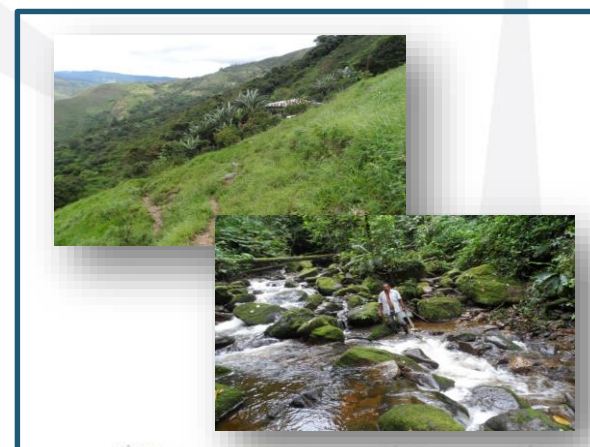

PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 18 CONSTRUCCIÓN 5 CUBIERTAS TIPO PARA POLIDEPORTIVO EN LOS BARRIOS PUERTA DEL SOL, LA REBECA, ANTONIO BARAYA, LUIS CARLOS GALAN Y CANDIDO NEIVA, HUILA, CENTRO ORIENTE

Código BPIN	2014004410068
Sector	Deporte - Infraestructura deportiva
Valor Total	\$ 1,177,137,282
Solicitud de recursos del SGR	\$ 1,177,137,282
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,83%
Otras fuentes	\$ 0
Tiempo de ejecución	6 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	INDERHUILA
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	INDERHUILA
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% Fuente: Mapa regalías 07/09/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.006 DE 2015 09/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 31 de Agosto de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación - Numero de escenarios deportivos recuperados, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye a propiciar condiciones óptimas para el disfrute de tiempo libre y esparcimiento de recreación, cultural y deportiva.

PERTINENCIA: El objetivo del proyecto es brindar adecuadas condiciones para realizar práctica deportiva y actividades recreativas en los Barrios Puerta del Sol, La Rebeca, Antonio Baraya, Luis Carlos Galán y Cándido V Etapa del municipio de Neiva Departamento del Huila.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015




Proyecto No. 19 CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS PLAN DE VIVIENDA LOS YALCONES DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

Código BPIN	2014004410045
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda urbana
Valor Total	\$ 885,553,746
Solicitud de recursos del SGR	\$ 400,000,000
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,28%
Otras fuentes	Comunidad Recursos Propios \$ 485.553.746
Tiempo de ejecución	4 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	FONVIHUILA
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	FONVIHUILA
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% Fuente: Mapa regalías 07/09/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.006 DE 2015 09/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Sin certificado, Pendiente expedición CDP de aportes de la comunidad

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda - Número total de viviendas iniciadas, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye al logro del indicador Población beneficiada con viviendas nuevas.

PERTINENCIA: El proyecto contribuye a mejorar el déficit habitacional del Municipio de La Argentina, el cual ha venido creciendo año tras año generando un alto índice de hacinamiento, pues existe un gran número de viviendas donde residen entre 2 y 3 familias por cada una; generando problemas de violencia intrafamiliar, casos de abuso sexual, afectando a más de 300 familias en el Municipio.

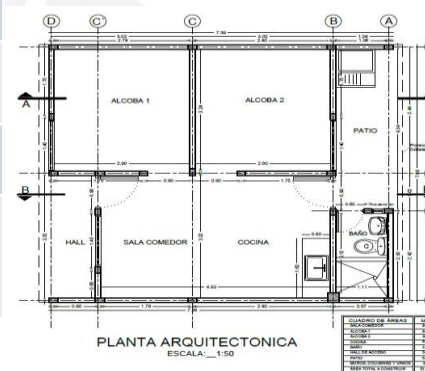

Solución Propuesta:
Las casas están conformadas por sala comedor, dos Alcobas, Cocina, Baño, Hall de Acceso, Patio
Área total a construir: 51,73 m2

PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 20 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código BPIN	2014004410055
Sector	Deporte - Fomento a la recreación, actividad física y deporte
Valor Total	\$ 1,016,481,033
Solicitud de recursos del SGR	\$ 1,016,481,033
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,72%
Otras fuentes	\$ 0
Tiempo de ejecución	4 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% Fuente: Mapa regalías 07/09/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.006 DE 2015 09/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 04 de Septiembre de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación - Numero de escenarios deportivos recuperados, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye a propiciar condiciones óptimas para el disfrute de tiempo libre y esparcimiento de recreación, cultural y deportiva. También el programa Prestación y garantía de servicios de deporte y aprovechamiento del tiempo libre del Plan de Desarrollo Municipal VILLAVIEJA UNIDOS POR EL CAMBIO.

PERTINENCIA: Con la ejecución del proyecto se busca tratar el problema de sedentarismo a temprana edad el que genera dificultades en la población adolescente que repercuten en la situación general de la salud pública de la población, además de problemas de convivencia entre familias y turistas.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 21 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIA CALLE 6 ENTRE CARRERA 4 Y VIA NACIONAL CENTRO POBLADO GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código BPIN	2014004410034
Sector	Transporte - Red urbana
Valor Total	\$ 353,556,103
Solicitud de recursos del SGR	\$ 253,556,103
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	17,58%
Otras fuentes	Suaza Recursos Propios \$ 100.000.000
Tiempo de ejecución	5 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE SUAZA
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	MUNICIPIO DE SUAZA
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% Fuente: Mapa regalías 07/09/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.006 DE 2015 09/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 17 de Junio de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Transporte - Kilómetros de red vial pavimentados, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye a aumentar las vías urbanas pavimentadas en convenios con los Municipios. También al programa mejores vías para el progreso del municipio del Plan de Desarrollo Municipal UNIDOS CONSTRUIMOS DESARROLLO.

PERTINENCIA: El mal estado y debilitamiento de la vía y redes de alcantarillado del centro poblado de guayabal ha venido generando problemas de movilidad e interconexión, aumento de accidentes de tránsito, retrasos en la movilidad de las personas como en los productos agropecuarios hasta el centro de recepción, aumento de enfermedades respiratorias e incremento del deterioro del parque automotor, dado lo anterior surgió el proyecto en mención para atacar dicha problemática.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 22 CONSTRUCCIÓN IV CENTENARIO SECTOR MARIA PAULA AGRUPACIONES A, B Y C NEIVA, HUILA

Código BPIN	2014004410046
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda urbana
Valor Total	\$ 32,771,200,000
Solicitud de recursos del SGR	Neiva Asignaciones Directas \$ 412.252.717 Huila Asignaciones Directas \$ 3.800.000.000
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	2,69%
Otras fuentes	Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio \$11.704.000.000 Neiva Recursos Propios \$ 4.202.685.000 Beneficiarios Ahorro \$ 1.850.000.000 Beneficiarios Crédito \$ 10.802.262.283
Tiempo de ejecución	10 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE NEIVA
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	MUNICIPIO DE NEIVA
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% Fuente: Mapa regalías 07/09/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.006 DE 2015 09/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Sin certificado, pendiente que la Entidad Ejecutora cumpla con los requisitos para expedir certificado

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda - Número de hectáreas habilitadas de suelo para vivienda, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye en concurrir a la financiación en el mejoramiento de viviendas, mediante la asignación de subsidios. También al programa unidos por unas viviendas saludables del Plan de Desarrollo Municipal UNIDOS PARA MEJORAR.

PERTINENCIA: La ejecución del proyecto busca disminuir el déficit habitacional del Municipio de Neiva, pues este ha venido creciendo generando un alto porcentaje en el índice de hacinamiento, dado que existe un gran número de viviendas donde residen entre 2 y 4 familias por cada una; ocasionando problemas de violencia intrafamiliar, casos de abuso sexual, entre otros debido al hacinamiento en que viven más de 2000 familias en el Municipio.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 23 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVÉS DE EMBRIONES VITRIFICADOS SEXADOS HEMBRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código BPIN	2015004410020
Sector	Agricultura - Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera
Valor Total	\$ 2,288,907,139
Solicitud de recursos del SGR	\$ 2,288,907,139
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	1,62%
Otras fuentes	\$ 0
Tiempo de ejecución	6 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	2% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 31/08/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.7 DE 2015 24/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 23 de Junio de 2015.

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Agropecuario - Productividad agropecuaria, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye en la aplicación de tecnología en los productos ganaderos del depto mediante el mejoramiento general bovino que permite incrementar la producción de leche en la región.

PERTINENCIA: El proyecto busca mejorar la productividad ganadera puesto que dicha actividad es el principal medio de vida de miles de familias rurales.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 24 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIMANÁ - COSANZA L=4 KM, DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código BPIN	2015004410017
Sector	Transporte - Vial Red Terciaria
Valor Total	\$ 4,470,500,607
Solicitud de recursos del SGR	\$ 4,470,500,607
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	3,16%
Otras fuentes	\$ 0
Tiempo de ejecución	8 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 31/07/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.7 DE 2015 24/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 18 de Septiembre de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Transporte - Kilómetros con mantenimiento rutinario, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye en mejorar la movilidad vial de la red secundaria. También al programa TRANSPORTE del Plan de Desarrollo Municipal UNIDOS POR UN TIMANÁ MEJOR.

PERTINENCIA: El proyecto surge debido a la dificultad en la movilidad vehicular entre las veredas: Montañitas, San Antonio, San Isidro, Santa Fé, Quinche, Naranjal, Centro Poblado Cosanza y sector La Bolsa en el municipio de Timaná. La actual vía que hace parte de la red vial terciaria se encuentra a nivel carreteable en mal estado, que al menor contacto con el agua de las precipitaciones se convierte en lodazal y fango, así mismo en épocas de lluvias las quebradas se activan ocasionando interrupciones en la vía debido a la carencia de obras de drenaje.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 25 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA VEREDA QUEBRADON SUR DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código BPIN	2015004410008
Sector	Transporte - Vial Red Terciaria
Valor Total	\$ 390,600,332
Solicitud de recursos del SGR	\$ 390,600,332
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,28%
Otras fuentes	\$ 0
Tiempo de ejecución	4 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE ALGECIRAS
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	MUNICIPIO DE ALGECIRAS
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% Fuente Mapa regalías 07/09/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.7 DE 2015 24/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 23 de Julio de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Transporte - Puentes construidos en la red vial principal, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye en mejorar la movilidad peatonal de la red vial secundaria. También al programa Puentes construidos, para interconexión de veredas del Plan de Desarrollo Municipal Trabajamos por ti Algeciras.

PERTINENCIA: La construcción del puente es de vital importancia para el desarrollo y sostenimiento socio-económico de este importante sector rural del municipio de Algeciras. La ausencia del mismo, encarece y dificulta la comercialización de productos agropecuarios, generando un impacto directo en la economía de esta comunidad, así como dificultad en los procesos sociales al ser muy reducida la movilización de personas a causa del peligro que significa el cruzar el afluente.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 26 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR L40MTS, EN LA VEREDA PARAISO VIEJO SECTOR LA VIRGINIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Código BPIN	2015004410007
Sector	Transporte - Vial Red Secundaria
Valor Total	\$ 1,193,232,454
Solicitud de recursos del SGR	\$ 1,193,232,454
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,84%
Otras fuentes	\$ 0
Tiempo de ejecución	4 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE ALGECIRAS
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	MUNICIPIO DE ALGECIRAS
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% Fuente Mapa regalías 07/09/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.7 DE 2015 24/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 23 de Julio de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Transporte - Puentes construidos en la red vial principal, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental contribuye en mejorar la movilidad vial y peatonal de la red vial secundaria. También al programa Puentes construidos, para interconexión de veredas del Plan de Desarrollo Municipal Trabajamos por ti Algeciras.

PERTINENCIA: El proyecto busca solucionar la dificultad de la población de movilizarse y transportar los productos agropecuarios que tradicionalmente se comercializan en la zona, especialmente con el Departamento del Caquetá, de igual forma la comunidad está seriamente afectada por cuanto los estudiantes ven limitado su desplazamiento hasta los centros educativos dado el riesgo que representa el cruzar el caudaloso Rio Neiva.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 27 MEJORAMIENTO DE 215 VIVIENDAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA

Código BPIN	2014004410058
Sector	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda urbana
Valor Total	\$ 638,550,000
Solicitud de recursos del SGR	\$ 638,550,000
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,45%
Otras fuentes (discriminar)	\$ 0
Tiempo de ejecución	4 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% Mapa regalías 07/09/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.7 DE 2015 24/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 25 de Junio de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Vivienda - Número de viviendas iniciadas por Macroproyectos, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiadas en la zona rural. También al programa vivienda del Plan de Desarrollo Municipal de corazón por Campoalegre.

PERTINENCIA: Aproximadamente 215 viviendas del Casco Urbano del municipio de Campoalegre, presentan deficiencias en las condiciones de higiene y seguridad, se evidencia carencia de pisos, pañetes y cubiertas en condiciones de precariedad y techos inseguros; lo anterior ha generado inconformismo en la población urbana y disminución en la calidad de vida por lo anterior surge el proyecto en busca de una solución a dicha problemática.



PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 28 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA CAMPOBELLO SOBRE LA QUEBRADA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA


Código BPIN	2014004410037
Sector	Transporte - Vial Red Terciaria
Valor Total	\$ 859,688,708
Solicitud de recursos del SGR	\$ 716,598,374
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,51%
Otras fuentes	Pitalito Recursos Propios \$ 143.090.334
Tiempo de ejecución	3 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 31/07/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.7 DE 2015 24/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 24 de Junio de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Transporte - Puentes construidos en la red vial principal, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental Mejorar la movilidad peatonal de la red vial secundaria. También al programa Vías para el Desarrollo Humano del Plan de Desarrollo Municipal Todos en Acción.

PERTINENCIA: Con el desarrollo del proyecto se busca eliminar el problema de 10.166 habitantes de la región con Baja comercialización de productos, congestión vehicular y embotellamiento de algunas veredas.



Solución Propuesta

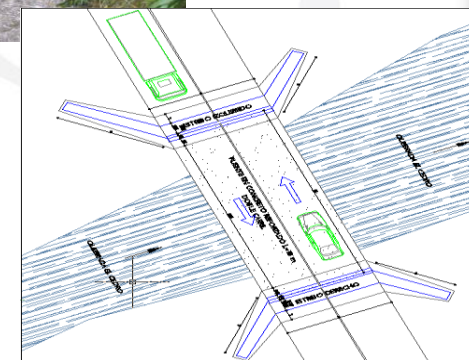

PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015




Proyecto No. 29 DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN - HUILA.

Código BPIN	2015004410018
Sector	Salud - Dotación, adquisición o reposición de equipos
Valor Total	\$ 2,000,000,000
Solicitud de recursos del SGR	\$ 400,000,000
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,28%
Otras fuentes	Ministerio De Salud Y Protección Social \$ 1,400,000,000 Ese Hospital Departamental San Vicente De Paul De Garzón \$ 200,000,000
Tiempo de ejecución	4 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% Fuente Mapa regalías 07/09/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No.7 DE 2015 24/06/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Sin certificado, pendiente que la Entidad Ejecutora cumpla con los requisitos para expedir certificado

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección - Número de afiliados al régimen subsidiado, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental proveer de equipos biomédicos a IPS Publicas para prestar un mejor servicio de salud a la población. También al programa Servicios generales de salud del Plan de Desarrollo Municipal LO NUESTRO ES LO SOCIAL.

PERTINENCIA: El objetivo del proyecto es solventar la necesidad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul del Municipio de Garzón, de adquisición y reposición de Equipos de última tecnología especializados, ya que algunos que posee están obsoletos y cumplieron su ciclo de vida útil, lo cual ocasiona retrasos en los resultados de diagnósticos médicos y deficiencia en la atención Hospitalaria, impidiendo prestar un servicio de salud con calidad, de forma oportuna y eficiente.

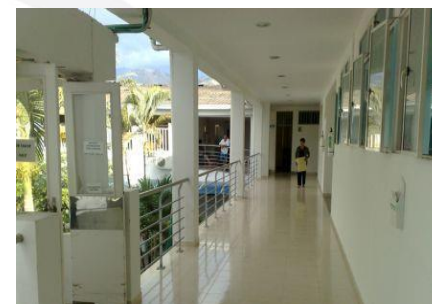

PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015




Proyecto No. 30 IMPLEMENTACIÓN E INTERVENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA CASA FISCAL DEL HUILA EN BOGOTA D.C.

Código BPIN	2015004410003
Sector	Cultura – Patrimonio
Valor Total	\$ 390,001,915
Solicitud de recursos del SGR	\$ 390,001,915
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	0,28%
Otras fuentes	\$ 0
Tiempo de ejecución	4 MESES
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Entidad responsable de contratar la interventoría o el apoyo a la supervisión.	DEPARTAMENTO DEL HUILA
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	N/A
Estado de ejecución	0% Fecha de corte del reporte de GESPROY: 31/07/2015
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No. 4 DE 2015 08/05/2015
Cumplimiento de los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección	Certificado expedido el 25 de Mayo de 2015

IMPACTO: Con el desarrollo del proyecto se impacta el Indicador de seguimiento al PND Interior - Ciudades y municipios con infraestructura de seguridad entregados, en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo Departamental de Infraestructura interinstitucional adecuada que facilite la promoción del desarrollo económico y social del departamento del Huila. También al programa Servicios generales de salud del Plan de Desarrollo Municipal LO NUESTRO ES LO SOCIAL.

PERTINENCIA: El proyecto surge para solucionar la necesidad de realizarle mantenimiento adecuado la casa fiscal del Huila en la ciudad de Bogotá, puesto que presenta deterioro progresivo en sus instalaciones ocasionando alto riesgo para el personal administrativo como para el público que la visita y dificultando su utilización.



Eflorescencias y podredumbre de pintura en muro oriental

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL



Total de recursos aprobados (2015 -2016) para proyectos de inversión con enfoque diferencial	0
% de aprobación de asignaciones directas	0%
% de aprobación de recursos del Fondo de Compensación Regional	0%

IDENTIFICACION DE PROYECTOS - ENFOQUE DIFERENCIAL

Dentro de la identificación de los proyectos que han llegado al Departamento Administrativo de Planeación Departamental se han recepcionado y realizado la respectiva revisión técnica, entre los cuales relacionaremos a continuación así:



MUNICIPIO	COMUNIDAD RESGUARDO INDIGENA	OBJETO DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTES
LA PLATA	Resguardo Indígena La Gaitana	Estudios y diseños para mejoramiento de red vial terciaria entre la Vereda El Rosal – Agua Negra – Vereda El Líbano	NO APLICA
	Juan Tama, Namisaka, Fsiw Páez y R. I. La Reforma	Estudio y diseños infraestructura educativa comunidad indígena Juan Tama, Nam misak, Fsiw Páez, R. I. La Reforma, La Gaitan y Potrerito del Municipio de La Plata	FASE II SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CUALES ESTAN PENDIENTES PARA SU INCLUSION
	Resguardo Indígena Nasa Estación Talaga	Construcción de tres (3) aulas escolares en la I.E. Yuuluck Pishau sede Peñón de Talaga resguardo indígena Nasa Estación Talaga Municipio de La Plata, dpto. Del Huila.	FASE III, falta anexas planos arquitectonicos, estudios de suelos, levantamiento topog.
	Resguardo Indígena Nasa de Juan Tama	Construcción de cubierta para polideportivo en la Institución Educativa Yuuluck Pishau del resguardo indígena Nasa de Juan Tama municipio de La Plata, departamento del Huila.	FASE III, REVISADO. Ajustes metodología, certificado municipal plan de desarrollo, certificado no zona de riesgo, jurisdicción del predio cavildo, presentar estudios y calculos, certificación de costos de la region mpio, certificado mpa plan de vida y anexos tecnicos coldeportes. falta anexas planos arquitectonicos, estudios de suelos, levantamiento topog.
MUNICIPIO	COMUNIDAD RESGUARDO INDIGENA	OBJETO DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTES
ARGENTINA	Resguardo Indígena Nam Misak	Construcción de cubierta para polideportivo en la Institución Educativa Hijos del Agua del resguardo indígena Nam Misak del municipio La Argentina, departamento del Huila	PROCESO DE AJUSTES METODOLOGICOS Y TECNICOS: falta anexas planos arquitectonicos, estudios de suelos, levantamiento topog.
	Resguardo Indígena Nuevo Amanecer	Construcción polideportivo cubierto en la Institución Educativa Hijos del Agua del resguardo indígena Nuevo Amanecer del	PROCESO DE AJUSTES METODOLOGICOS Y TECNICOS: falta anexas planos arquitectonicos, estudios de suelos, levantamiento topog.
	Resguardo Indígena Pic Kwe Lkh	Mejoramiento de vivienda para la población Resguardo Indígena Pic Kwe Lkh del municipio de La Argentina	Fase III: Proyecto ajustado y realización de certificado d inclusion en el plan de desarrollo Departamental y firmado. ENTREGADO PARA SER CARGADO - JUAN CARLOS
MUNICIPIO	COMUNIDAD RESGUARDO INDIGENA	OBJETO DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTES
PITALITO	Resguardo Indígena Yanacona – Rumigaco	Construcción de la casa del Conocimiento Maloca ritos ancestrales en el R. I. Yanacona –	FASE III, falta anexas planos arquitectonicos, estudios de suelos, levantamiento topog.
MUNICIPIO	COMUNIDAD RESGUARDO INDIGENA	OBJETO DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTES
RIVERA	Tamas Páez Dujos del Caguan Paniquita	Construcción de una maloca en el resguardo indígena Tamas Páez Dujos del Caguan Paniquita del municipio de Rivera departamento del Huila	* Realizar Acta de concertacion Comunidad y Alcaldia Realizar ajustes solicitados del acta de revision.
MUNICIPIO	COMUNIDAD RESGUARDO INDIGENA	OBJETO DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTES
SAN AGUSTIN	Cabildo Indígena Etnia Yanacona de San Agustín	Mejoramiento de 50 viviendas rurales para el cabildo indígena San Agustín del Departamento del Huila	FASE III, Ajuste en metodología, certificados y cartas presentación, actualizar certificados planeacion y de riesgo, diagnostico general y documentacion de los beneficiarios, Diagnostico.
MUNICIPIO	COMUNIDAD RESGUARDO INDIGENA	OBJETO DEL PROYECTO	TIPO DE AJUSTES
PALESTINA	Cabildo Yacuas Yanacona	Mejoramiento de 46 viviendas para el cabildo indígena Yanacona Yacuas del Municipio de Palestina – Huila.	FASE III, VISITAS DE CAMPO VIVIENDAS, LEVANTAMIENTO DOCUMENTAL DE BENEFICIARIOS, CRONOGRAMA, PLANO VISTA, ENTRE OTROS.
	Cabildo Yacuas Yanacona	Adquisición de terreno y construcción de aula para el Cabildo Yakuas Yanacona en el municipio de Palestina – Huila	FASE III, falta anexas planos arquitectonicos, estudios de suelos, levantamiento topog.

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL



SITUACION ACTUAL

En el primer semestre no se aprobó ningún proyecto de enfoque diferencial por cuanto no se registró ningún proyecto con el cumplimiento total de los requisitos para ser aprobados por los OCAD, debido a la deficiencia de información técnica en cuanto a diseños, cálculos, estudios topográficos, lo cual han prolongado el tiempo de subsanación de cada una de los problemas, haciéndose imposible su corrección por parte del formulador contratado por las comunidades. Igualmente no se llegó en el primer semestre a la concertación de una iniciativa viable de inversión. Actualmente se encuentran dos proyectos pendientes para aprobación en el segundo semestre.

ACCIONES REALIZADAS

La Gobernación del Huila con el fin de contribuir al desarrollo de los diferentes proyectos dentro del Enfoque Diferencial a proyectado a concertación con las comunidades con el fin de adelantar el desarrollo del proyecto es Estudio y diseños infraestructura educativa comunidad indígena Juan Tama, Namisaka, Fxiw Páez y R. I. La Reforma, Nasa Estación Talaga, Nasa de Juan Tama, Nam Misak y Nasa de Juan Tama de los municipios de La Plata y la Argentina del Departamento del Huila, con el cual se pretende recopilar un sin número de obras prioritarias de las comunidades de los Municipios de la Plata y la Argentina, que permita tener como producto dichos estudios para el debido proceso de contratación sin problema alguno y de esta forma dar cumplimiento a las inversiones y metas propuestos dentro del Plan de Desarrollo Departamental y de los Municipios.

OTROS PROYECTOS

Se ha concertado el apoyo e inversión de recursos en proyectos para comunidades indígenas de los Municipios de: TESALIA, ISNOS y SANTA MARIA.

CONCLUSIONES

Es de resaltar que existe el compromiso, la concertación y la disposición de los recursos de los diferentes entes territoriales del Departamento del Huila, para los diferentes proyectos enmarcados dentro del Enfoque Diferencial, el cual se dará continuidad con el acompañamiento y la asistencia técnica para las diferentes comunidades en la solución a las problemáticas existentes en los Resguardos y Comunidades Indígenas.

AJUSTES



Nombre del proyecto:	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
Cód. BPIN:	2014004410030
Tipo de ajuste:	ACUERDO No. 2 DE 2015 Cambio de entidad pública ejecutora e instancia encargada de contratar la interventoría

Nombre del proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANA CONA VEREDA NUEVA ZELANDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
Cód. BPIN:	2013004410068
Tipo de ajuste:	ACUERDO No.006 de 2015 Aumento de valor del proyecto

Fuentes de financiación:

Fuente	Valor aprobado por el OCAD inicialmente	Valor ajustado solicitado	Valor total ajustado
Asignaciones Directas	\$ 998,667,127	\$ 417,369,468	\$ 1,416,036,595
TOTAL	\$ 998,667,127	\$ 417,369,468	\$ 1,416,036,595



AJUSTES



Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO Y VIA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA
Cód. BPIN:	2014004410006
Tipo de ajuste:	ACUERDO No.7 de 2015 Aumento de valor del proyecto

Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO - AGUA BLANCA - EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
Cód. BPIN:	2014004410004
Tipo de ajuste:	ACUERDO No.7 de 2015 Aumento de valor del proyecto

Fuentes de financiación:

Fuente	Valor aprobado por el OCAD inicialmente	Valor ajustado solicitado	Valor total ajustado
Asignaciones Directas	\$ 464,386,726	\$ 198,895,643	\$ 663,282,369
TOTAL	\$ 464,386,726	\$ 198,895,643	\$ 663,282,369

Fuentes de financiación:

Fuente	Valor aprobado por el OCAD inicialmente	Valor ajustado solicitado	Valor total ajustado
Asignaciones Directas	\$ 4,986,232,788	\$ 1,484,455,400	\$ 6,470,688,188
TOTAL	\$ 4,986,232,788	\$ 1,484,455,400	\$ 6,470,688,188

AJUSTES



Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INES MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Cód. BPIN:	2014004410003
Tipo de ajuste:	ACUERDO No.7 de 2015 Aumento de valor del proyecto

Fuentes de financiación:

Fuente	Valor aprobado por el OCAD inicialmente	Valor ajustado solicitado	Valor total ajustado
Asignaciones Directas	\$ 2,350,496,370	\$ 554,874,033	\$ 2,905,370,403
TOTAL	\$ 2,350,496,370	\$ 554,874,033	\$ 2,905,370,403

Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA
Cód. BPIN:	2014004410002
Tipo de ajuste:	ACUERDO No.7 de 2015 Aumento de valor del proyecto

Fuentes de financiación:

Fuente	Valor aprobado por el OCAD inicialmente	Valor ajustado solicitado	Valor total ajustado
Asignaciones Directas	\$ 2,374,798,064	\$ 1,175,689,802	\$ 3,550,487,866
TOTAL	\$ 2,374,798,064	\$ 1,175,689,802	\$ 3,550,487,866

LIBERACIÓN DE RECURSOS



Código BPIN	2014004410043
Sector	Comercio, Industria y Turismo - Fondos de capital emprendedores
Valor Total	\$ 500,000,000
Solicitud de recursos del SGR	\$ 500,000,000
% recursos del SGR sobre el total de recursos asignados	
Otras fuentes	\$ 0
Fecha del acuerdo de aprobación del proyecto	ACUERDO No. 3 DE 2015 13/04/2015



GRACIAS

