	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1	Código: 201
		Fecha: 01-Abril-2015
	ACTAS	Versión No. 1.0
		Página 1 de 1

**EL INGENIERO UVERLEY SAENZ RAMIREZ EN CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL DE INTEGRAL RESOURCES S.A.S INTERVENTOR**

CERTIFICA:

Que el proyecto de inversión aprobado mediante Acuerdo 14 del 27 de diciembre de 2018 del OCAD Departamental Huila, cuyo objeto es” **MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA GALILEA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA**” código BPIN 2018004410396, a la fecha presenta el siguiente avance físico y financiero, según reporte del GESPROY-SGR:

Avance financiero: 0%

Avance Físico: 58%

Dado en el municipio de Palestina departamento del Huila a los 01 días del mes de Agosto de 2019.

Uverley Saenz

UVERLEY SAENZ RAMIREZ
R/L Integral resources s.a.s
Interventor



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA DE INFORMACION DE PROYECTO

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN



Fecha reporte

Thursday August 1 2019 2:49 PM

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA GALILEA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA									
Código BPIN	2018004410396		Sector reclasificado SMSE			Deporte - Fomento a la recreación, actividad física y deporte				
Localización	Departamento		Municipio				No. Beneficiarios		284	
	HUILA		PALESTINA							
Plazo inicial (meses)	3.00	Plazo transcurrido (meses)	4.00	Plazo estimado (meses)	6.90	Fecha Inicio	01/05/2019	Fecha Final	31/07/2019	
Productos							Unidad		Cantidad	
Cancha mejorada							Número de canchas		1	

APROBACIÓN




Ocad	DEPARTAMENTO DE HUILA	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION	
Entidad Ejecutora		PALESTINA - HUILA		Entidad Interventora	PALESTINA-HUILA	
Acuerdo		Fecha		Ocad		
014		27/12/2018		DEPARTAMENTO DE HUILA		
Ajustes						
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo	Fecha

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		419,598,390	100.00	419,183,010	0	419,598,390
Fondo De Compensación Regional	PALESTINA-HUILA	419,598,390	100.00	419,183,010	0	419,598,390
TOTAL FUENTES APROBADAS		419,598,390	100.00	419,183,010	0	419,598,390
TOTAL FUENTES		419,598,390	100.00	419,183,010	0	419,598,390

EJECUCIÓN


Estado: CONTRATADO EN EJECUCIÓN

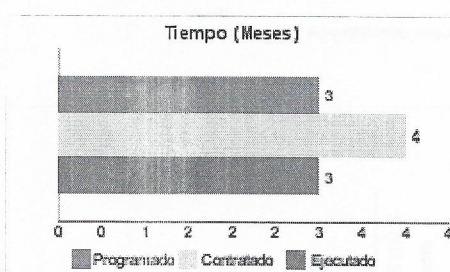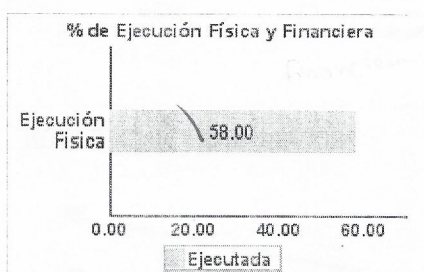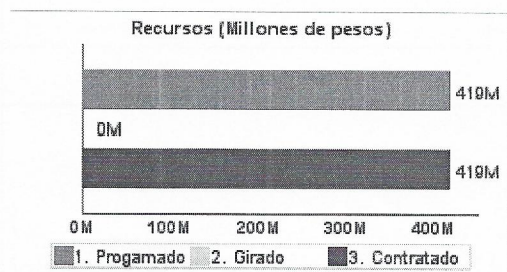

CONTRATACIÓN

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Ejecución inversión	391,732,648	0	.00
1	Interventoría	27,450,362	0	.00
		419,183,010	0	.00

% Ejecución Financiera Agregada de Contratos



Fecha reporte

Thursday August 1 2019 2:49 PM

# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
3	2019-jul	100.00	100.00	57.97	.00
4	2019-ago			57.97	

ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
Información inconsistente-II	GESPROY-SGR	0
	SUBTOTAL	0
No reporte de información-NRI	GESPROY-SGR	0
	SUBTOTAL	0
	TOTAL	0
